

事業戦略ビジョン

商用電動車普及に向けたエネルギーマネジメントシステムの構築・大規模実証

実施者：西濃運輸株式会社

取締役社長 高橋 智

コンソーシアム内実施者：佐川急便(株) 西濃運輸(株) (株)セブン-イレブン・ジャパン 日本通運(株) 日本郵便(株)
[50音順] (株)ファミリーマート 福山通運(株) ヤマト運輸(株) (株)ローソン

目次

0. コンソーシアム内における各主体の役割分担

1. 事業戦略・事業計画

- (0) 外部環境変化
- (1) 産業構造変化に対する認識
- (2) 市場のセグメント・ターゲット
- (3) 提供価値・ビジネスモデル
- (4) 経営資源・ポジショニング
- (5) 事業計画の全体像
- (6) 研究開発・設備投資・マーケティング計画
- (7) 資金計画

2. 研究開発計画

- (0) 課題の対策方策
- (1) 研究開発目標
- (2) 研究開発内容
- (3) 実施スケジュール
- (4) 研究開発体制
- (5) 技術的優位性

3. イノベーション推進体制

(経営のコミットメントを示すマネジメントシート)

- (1) 組織内の事業推進体制
- (2) マネジメントチェック項目① 経営者等の事業への関与
- (3) マネジメントチェック項目② 経営戦略における事業位置づけ
- (4) マネジメントチェック項目③ 事業推進体制の確保

4. その他

- (1) 想定されるリスク要因と対処方針
- (2) 社会・産業全体への貢献

0. コンソーシアム内における各主体の役割分担

エネルギーマネジメントシステム構築・大規模実証を通じた電動車普及によるカーボンニュートラル実現

CJPT(株)
[幹事会社]

共同実施者

■ 研究開発内容

- ・プロジェクト全体統括
- ・エネマネ開発/検証とりまとめ
- ・エネマネシステムの機能要件検討

■ 事業化に向けた取組内容

- ・エネマネを活用したビジネス立案
(ビジネス内容、市場、お客様の発掘)
- ・CNに関する国民/社会への発信、
理解活動

佐川急便(株) 西濃運輸(株)
(株)セブン-イレブン・ジャパン 日本通運(株)
日本郵便(株) (株)ファミリーマート
福山通運(株) ヤマト運輸(株) (株)ローソン

※

共同実施者

■ 研究開発内容

- ・物流オペレーションへの電動車/エネマネ
システムの導入および検証
- ・データ収集 (車両データ、運行情報 等)

■ 事業化に向けた取組内容

- ・CNシナリオに沿った電動車導入加速
- ・電動車の最適な配置検討
(FCEV/BEVの使い分け)
- ・電動車の大規模導入時の
物流オペレーションの検討



1. 事業戦略・事業計画

1. 事業戦略・事業計画／（0）外部環境変化と研究開発計画・社会実装への影響



提案時と比べた外部環境変化に対し、計画の見直し有無を記載

- 水素普及の機運の高まりなどから 早期事業化についても今後検討
- 水素価格高騰やインフラ整備遅れによる計画の見直しが必要であり、現在精査中

外部環境等の変化点

- Positive** 
- 経産省による水素基本戦略見直し
⇒水素普及機運の高まり
(水素導入目標2040年 1,200万トン/年追加、規制・支援一体型制度構築、値差支援)
- Negative** 
- 重点地域政策による、自治体ごとの非化石燃料車への需要の高まりと環境整備の加速
 - インフラ整備・運営への難しさ顕在化
⇒新設水素STの計画中止・水素価格高騰
 - 2024年問題による物流事業ドライバー不足
 - 世界的なEV需要による部品手配への影響

研究開発計画・社会実装への影響

- 
- 需要・ニーズの高まりから早期事業化の検討必要
- 
- FCEV導入計画への影響
 - 水素ST新設遅れ⇒計画事業所への車両導入不可
 - 水素価格高騰⇒事業者負担増による
車両導入台数削減
 - ドライバー不足⇒実証車を任せられるドライバー不足
による、車両稼働率低下
 - 部品手配影響⇒車両開発日程への影響

提案時と比較した外部環境変化による計画修正

- 早期事業化については検討のみ。現時点計画修正なし
- 導入計画の見直しが必要であり、現在精査中。
 - ・FC小トラ：インフラ整備が整わない地域への車両導入予定の変更、実証実績を考慮した物流事業者計画変更
 - ・FC大トラ、BEV軽バン：車両開発日程変更による、実証開始時期の変更
 - ・BEV低床小トラ：車両仕様と事業者ニーズのアンバランス

1. 事業戦略・事業計画／（1）産業構造変化に対する認識

環境問題への意識変化・政策等の影響により商用燃料電池車産業が拡大すると予想


カーボンニュートラルを踏まえたマクロトレンド認識

- （社会面）
- 豪雨等の自然災害の増加、気候変動の影響により、地球温暖化への関心高まり
- （経済面）
- HV、EV等低燃費車両の競争激化
 - 車両、インフラ、燃料と社会コストの増加
- （政策面）
- 2050年 カーボンニュートラル実現
 - 2030年 運輸部門CO2排出量削減目標：▲35%（2013年比）
 - 2030年 水素消費量目標（運輸部門）：8万トン/年
 - 2030年 特定事業者への非化石燃料車保有割合5%指針
- （技術面）
- HV、PHV、EV、FCと乗用車の世界では様々な選択肢が確立
⇒商用車へ順次展開が始まる
 - バッテリーの進化等による、燃料電池車の航続距離延長

● 市場機会
カーボンニュートラルに実現に向けた「国の'30年電動化目標」

（車両）	
8t以下：新車販売20～30%	
8t超：保有5,000台	
（水素消費量）	
8万トン/年	
	（目標達成に必要な台数見積り）
	FC小トラ：22,000台
	FC大トラ：5,000台
	バス：930台
	乗用車：60,000台

カーボンニュートラル社会における影響を模式的に記載

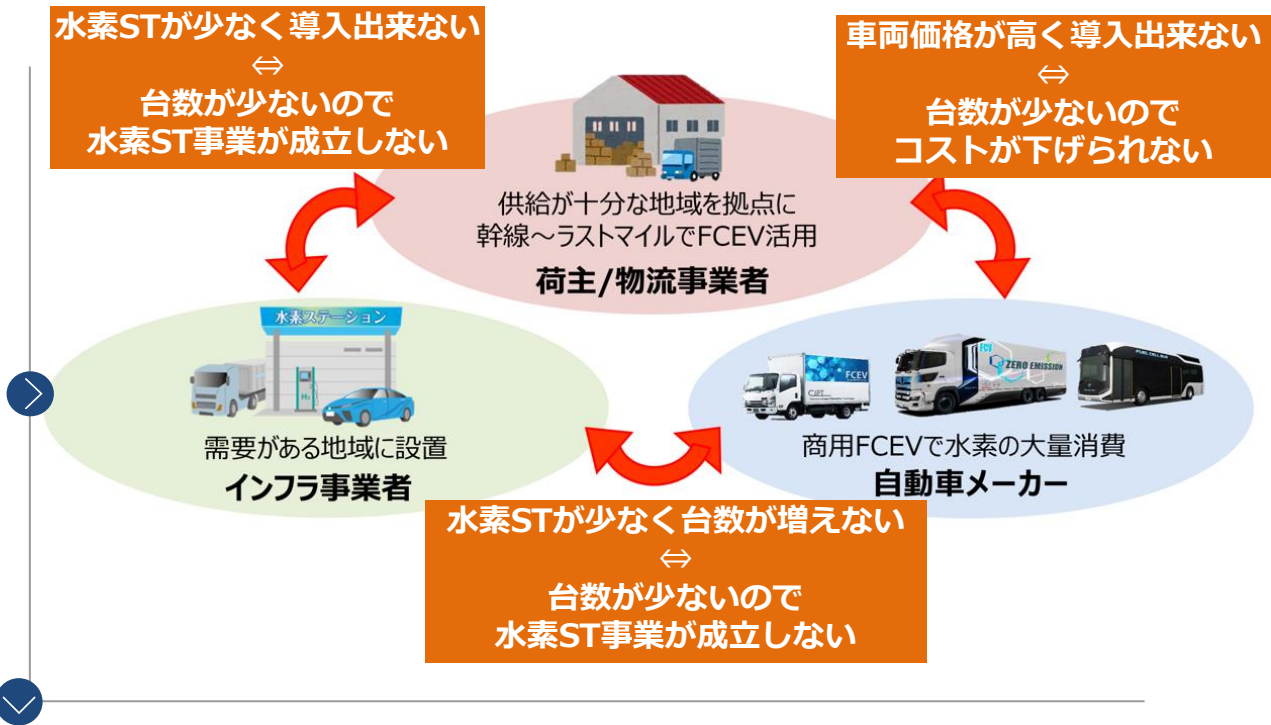

- 政府目標の達成に向けて
- CJPTとして商用FCEV/BEV導入を推進
 - 「社会コスト」を下げる事が不可欠
 - 直面する課題解決が、産業発展・国際競争力強化のチャンス


1. 事業戦略・事業計画／（2）市場のセグメント・ターゲット

カーボンニュートラル実現に向けた「CASE」技術の普及を、
「つくる」「はこぶ」「つかう」が一体となって取り組むことのできる商用車で推進

- (大)
- ・車両OEM各社ラインナップにて全ての物流事業者をターゲットに幹線～ラストマイルまで対応
 - ・物流事業者の使用実態（走行距離、積載量、運行ルート、時間帯、規模 etc.）を踏まえ、インフラ事業者、荷主/物流事業者を交えた三位一体となって電動車普及の仕組みを構築

積載量

(小)

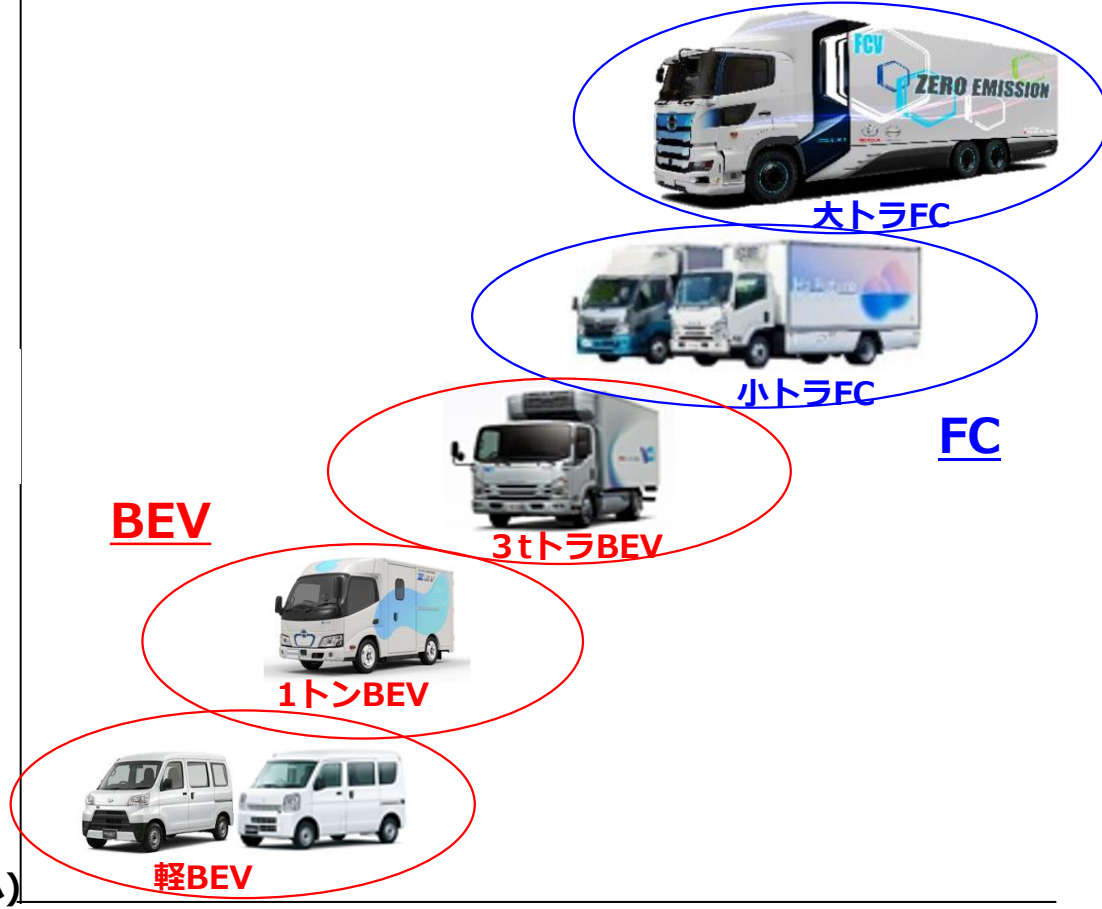

(短) : ラストマイル 走行距離 (長) : 幹線輸送

■ 市場概要と目標とするシェア・時期

- ・自動車メーカーのフルラインナップで、30年政府電動化目標達成を目指す
 - 8t以下：新車販売20～30% ※30年累計小トラFC：1.2～2.2万台
 - 8t 超：保有5,000台

■ 商用車分野

※'22/12 第4回モビリティ水素官民協議会 資料より

需要家	主なプレイヤー		車格	燃料消費	動力源	充電・充填設備	課題	想定ニーズ
物流事業者	一次・幹線	広域運輸業者	(大)	(大)	FC	(大)	・夜間、高速走行への対応	・高速道路上での充填設備 且つ夜間営業
	二次・ミドル	店舗配送業者	↑	↑	BEV	敷地面積	・車格大のため充填設備の敷地面積大	・大型車専用充填設備
	ラストマイル	宅配業者	(小)	(小)			・こまめなストップ＆ゴー	・充電器の設置加速
							・配送ルート不定（主に個配）	・経路充電

1. 事業戦略・事業計画／（3）提供価値・ビジネスモデル

エネマネ技術を用いて商用ならではの製品・サービスを提供する事業を創出/拡大

【前提条件】
CO2排出量削減のための商用電動車普及には
様々な物流事業者の課題発生すると想定

- 充填/充電のダウンタイム発生
- 導入運用のコスト増加



社会・顧客に対する提供価値

- 充填/充電のダウンタイム低減
 - 配送計画を連携したシステムによりダウンタイムがMINになる充填/充電のステーションの場所とタイミングを提案
- 導入運用のコスト低減
 - 水素ST/充電STの稼働率を上げつつ、ダウンタイムなく平準化する予約割当することでランニングコストの適正化を図る
 - 充電タイミング/量の最適化を図り、インシヤル・ランニングコストの最適化を狙う

ビジネスモデルの概要（製品、サービス、価値提供・収益化の方法）と研究開発計画の関係性

1. 車両/ST情報の提供

FCEV/BEV
共通



- ・航続可能距離/範囲
- ・リアルタイム待ち台数/時間
- ・混雑予想
- ・STからのメッセージ通知 etc.

水素欠/電欠の不安解消
STの混雑回避

※車両/ST情報の提供は
GI事業(エネマネ開発)の対象外

2. 配送計画と一体となった 最適な充填/充電計画


FCEV/BEV
共通



充填/充電待ちダウンタイム低減

3. 建屋電力ピークシフト

BEV固有



- ・充電タイミング/量の最適化による電力ピーク低減
- ・配送計画連携による建屋充電器数の最適化

電力/充電器コストの低減

1）標準化戦略の前提となる市場導入に向けての取組方針・考え方

電動車の特性を熟知した自動車OEMの強みを活かし、物流関連産業競争力向上に貢献するという観点からオープン/クローズ戦略を駆使し、運行管理/配送計画と一体となったサービスを創造し、成果最大化を目指す。


2）国内外の動向と自社のルール形成（標準化等）の取組状況（国内外の標準化や規制の動向）

- エネマネサービスと運行管理との物流オペレーションは、SIP主導の「物流情報標準ガイドライン」に準拠し運行管理者端末と連携
- 充電・充填インフラ（ST運用事業者）との連携は既存プロトコルに準拠し、サーバー間のデータ授受にて推進

（市場導入に向けた標準化・知財・規制対応等に関する取組）

研究対象範囲との外部IFを5つに層別し活動推進

IF種類 (IN/OUT)	標準プロトコル (有、なし)	CJPTが制御 (可、不可)	取組方針
IN	有	—	標準 標準プロトコル（OCPI等）に従ったデータ入力
IN	なし	可	集合知 CJPT OEM間で必要なデータ（集合知）を共有
IN	なし	不可	変換 外部Sys.との違いを吸収する変換モジュール適用
OUT	有	—	標準 標準プロトコル(OCPI等) に従ったデータ出力
OUT	有	—	API公開 物流情報標準ガイドラインに従ったAPI公開

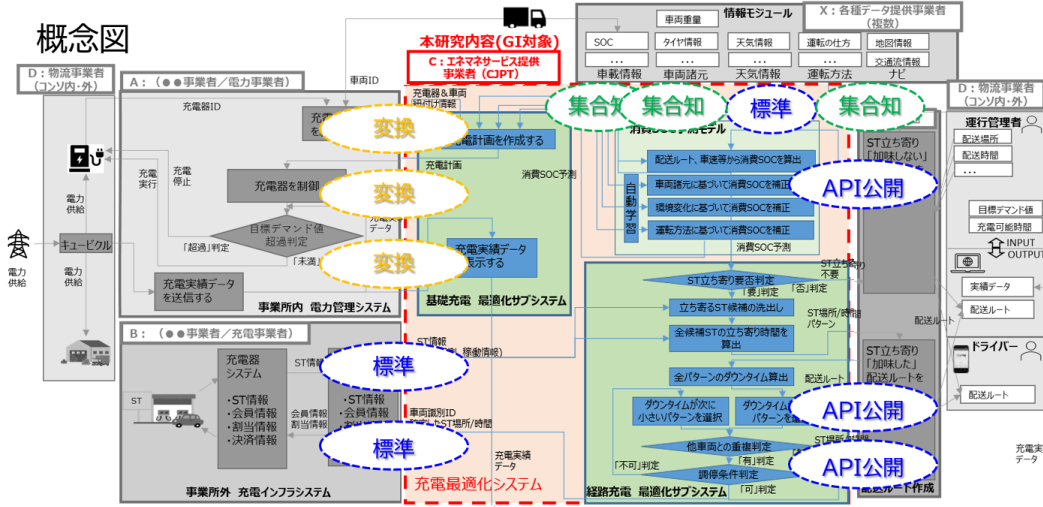

3）本事業期間におけるオープン戦略、クローズ戦略の具体的な取り組み内容

◆オープン戦略（標準化戦略）

- ① OEMの強みである高精度航続距離予測によるダウンタイム回避できるリアルタイム性と信憑性高い充填・充電タイミング提案を物流事業者に提供。サービス機能を各OEMにAPI公開、普及を目指す。
- ② インフラ等との通信は既存の標準プロトコルを活用。標準でカバーされない場合は、プロジェクト全体として検討

◆クローズ戦略（知財戦略）

- ① 商用エネマネサービスに活用する基本アルゴリズムは、既存知財も組み合わせ構成。機能アルゴリズムは非公開で推進
- ② 電動車導入の肝となる物流事業者のダウンタイム低減を図るため、サービス品質確保に向けた特許戦略を推進

日本の強みである「モノづくり」「高度な物流システム」を活かすことで社会コストを削減 カーボンニュートラルへの取り組みを通じて、国際競争力を強化

自社の強み、弱み（経営資源）

■ターゲットに対する提供価値

- ・「Team Japan」として業種間、会社間の垣根を超えた技術提案、支援体制・サポート
- ・ハード面での「車両供給」とソフト面での「運行管理が一体となったエネマネシステム」を組み合わせることで社会コスト低減



■自社の強み

- ・車両OEMと物流事業者のコンソーシアムとして実証データにもとづくエネマネ開発
- ・個社の「技術力」「専門領域」と物流業者の意見を反映することで使い勝手の良いシステム提供とダウンタイム軽減に寄与

■自社の弱み及び対応

- ・各事業会社から風土・バックグラウンドの異なるメンバーでの構成のため、協業会社としての方針決めコンセンサスに時間を要す
- ・対応として情報提供・情報共有の場を肌理細かく設定迅速化を図る

競合との比較

- ・車両OEMと物流事業者での協業による正確な実証データ入手が可能、エネマネシステム開発により、電動車普及とCO2削減を推進

		技術	顧客基盤	サプライチェーン	その他経営資源
自社	現状	・小トラBEV・FC導入による実装データによるエネマネ開発	・コンソ内事業者中心に電動車導入	・車両OEMとコンソ内物流事業者協業による効率的かつ確実な車両実装	・水素ステーション緊急通知システム ・カメラ設置によるステーション混在状況把握
	今後	・エネマネによるダウンタイムの削減 ・大トラFC導入で幹線物流に貢献	・コンソ外及び車両OEMと関係のある事業者中心に顧客拡大	・国、及び地公体と連携した重点地域戦略の推進	・エネマネによる充填・充電時刻、及び配送ルート最適化
	海外競合	・電動車導入に限定	・個社単位での導入	・限定的	—

9

‘30年 国の電動化目標達成に向けて、商用電動車の価格低減と台数拡大を図る

コンベ（ディーゼル）

大型トラック ‘25年～ 実証
小型トラック ‘23年～ 実証

～‘29 本格導入




‘30 普及（国の電動化目標）

台数増と合わせて車両コスト低減を推進し、普及に向けた車両価格帯を目指す


官民一体となった取り組みで
事業性成立を目指す

- ①エネマネによるダウンタイム低減
※台数拡大にはダウンタイムをコンベ並に近づける必要あり
- ②車両コスト低減
- ③水素ST拡大・水素コスト低減
- ④補助/規制緩和など各種施策 etc.

＜お客様の 月々のお支払いイメージ＞

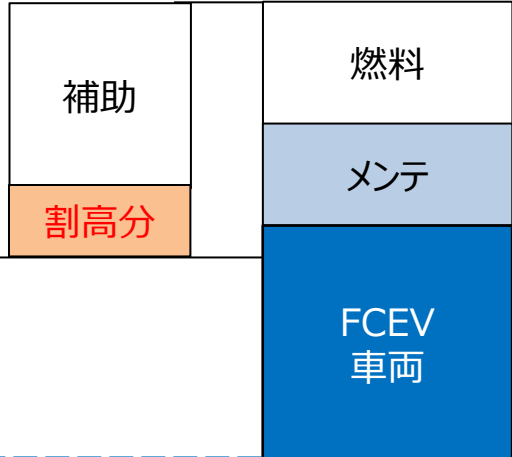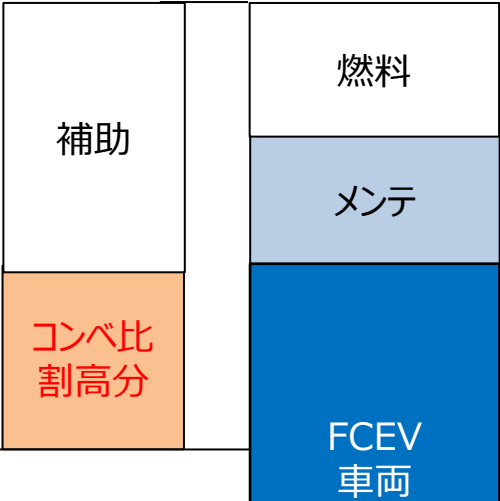


エネルギーマネジメントシステムを全車両へ実装し、'30年 商用電動車の本格普及を目指す
車両コスト低減を推進し、補助金に頼らない事業構造を目指す

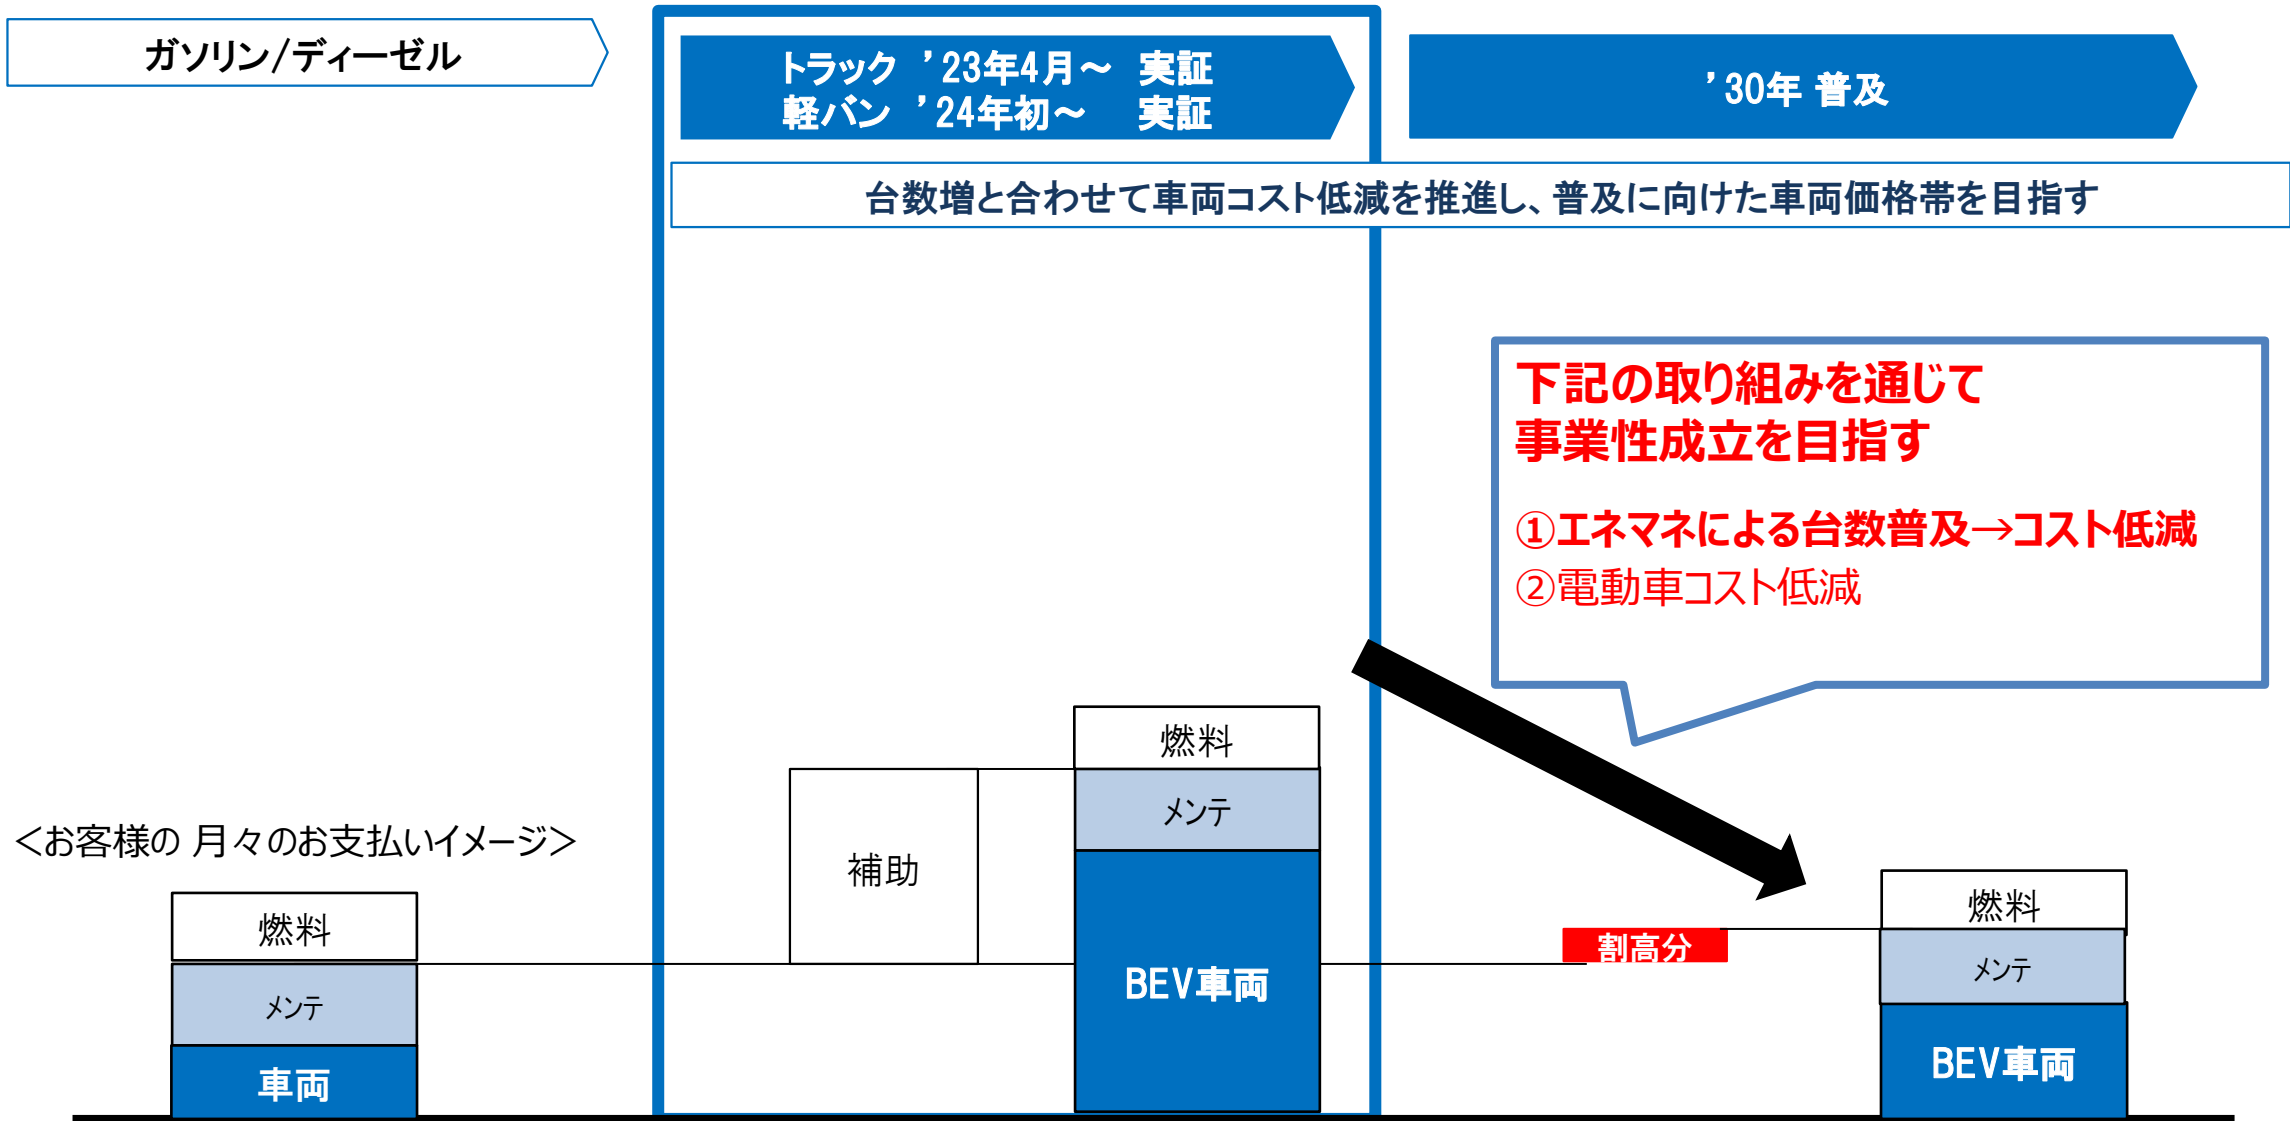


1. 事業戦略・事業計画／（6）研究開発・設備投資・マーケティング計画

‘30年以降の本格普及に向けて、「つくる」「はこぶ」「つかう」が一体となった研究開発・投資を推進
 合わせて規格化・標準化や規制緩和、CO2削減量見える化等に取り組み

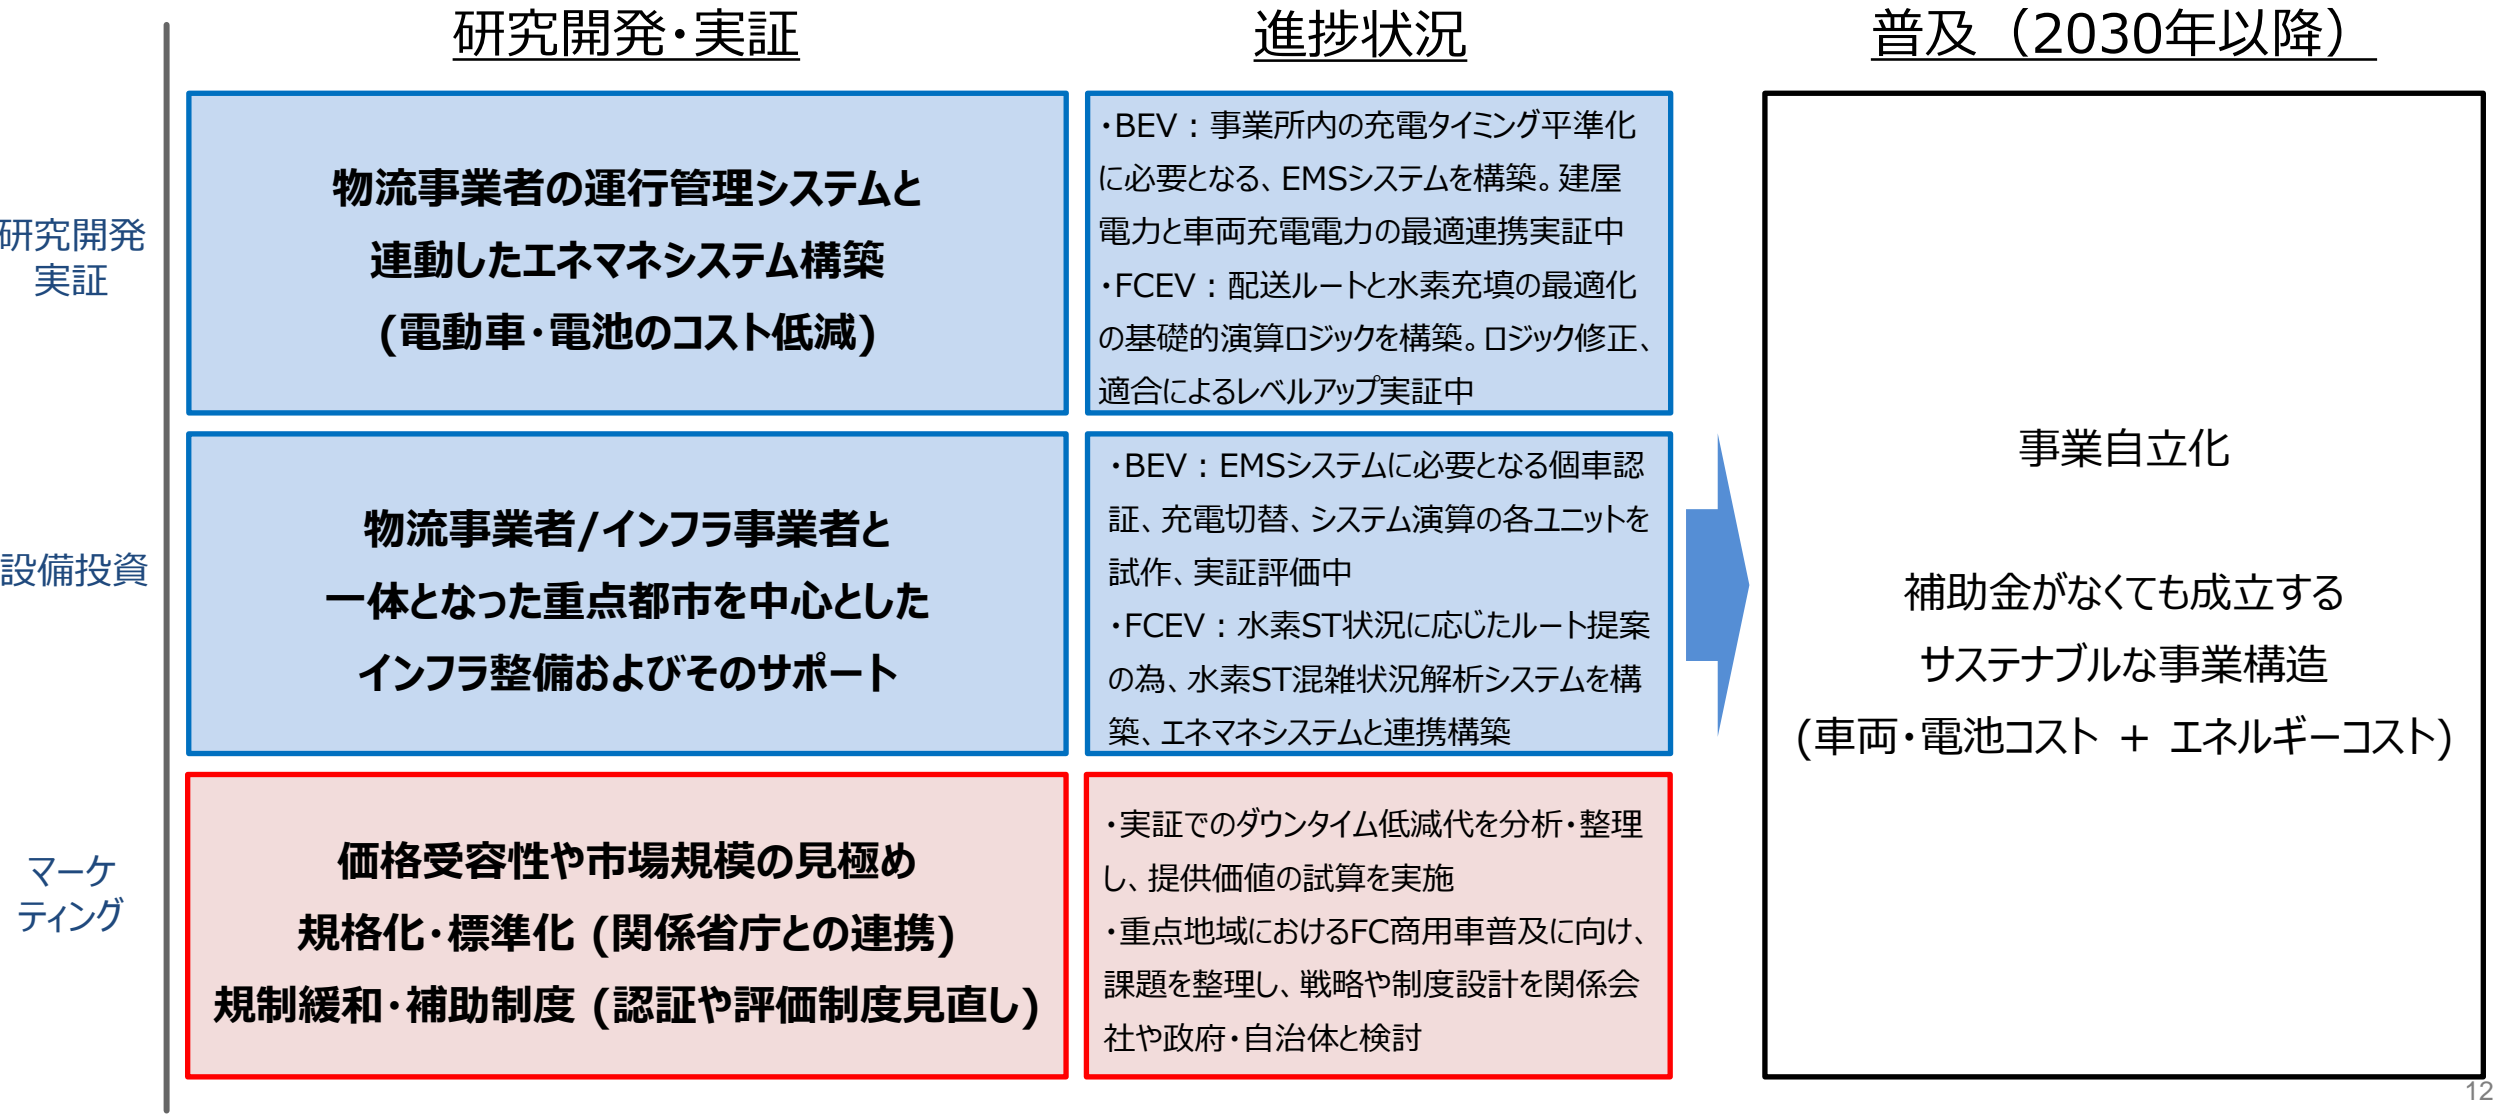

国の支援に加えて、コンソーシアム全体で130億円規模の自己負担を予定

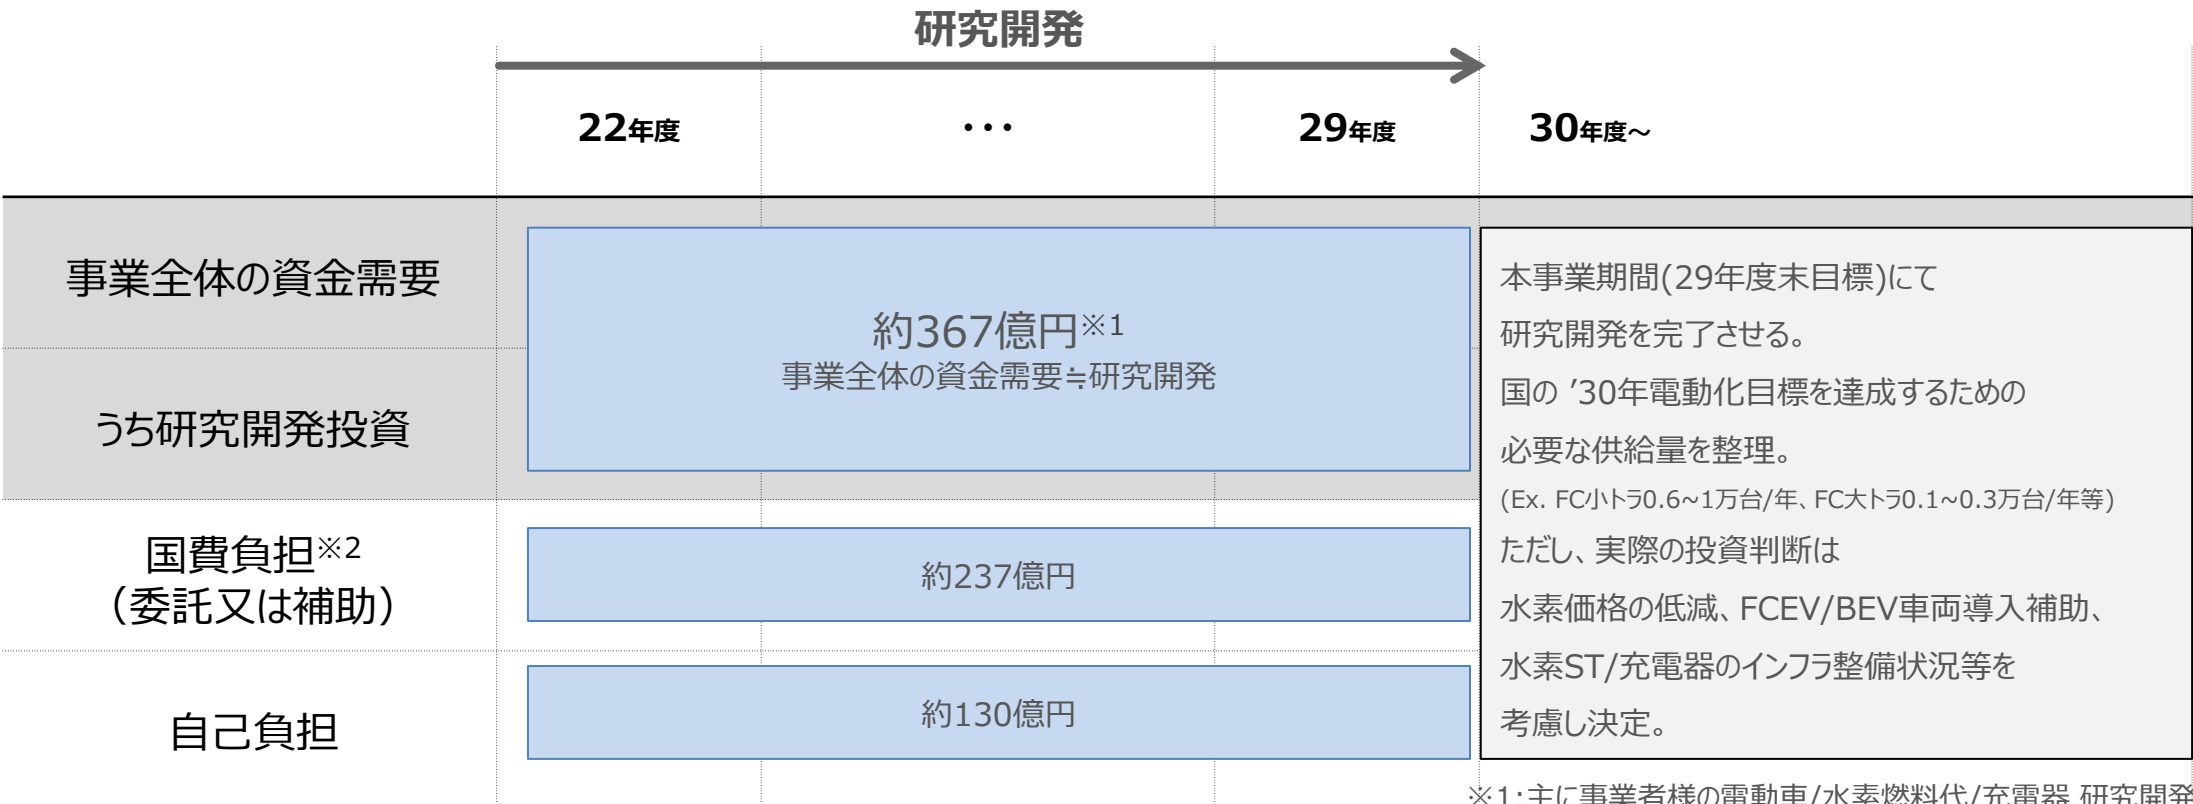

※1:主に事業者様の電動車/水素燃料代/充電器 研究開発補助
※2:インセンティブが全額支払われた場合

2. 研究開発計画

2. 研究開発計画／（0）課題の対策方法（FCEV&BEV）

本実証で取り組む課題範囲

FCEV

BEV

商用電動車普及には多くの課題が存在、解決に向けて国・各事業者が一体となった取り組みが必要

本実証で
取り組み

物流事業者



- 水素充填/充電による物流ダウンタイム
- コスト低減
 - ・燃料
 - ・充電器の導入/運用
 - ・車両の導入/運用

etc.

インフラ事業者



- 水素価格(現状は軽油の2倍)
- 水素STの数・営業時間
- 充填時間
- 水素ST建設費/運営費

etc.

自動車OEM



- 車両価格
- 台数(生産)
- 車両種類(開発)
- 積載量・航続距離

etc.

国

- 目標設定 (水素消費量) ・ 各事業者とりまとめ (モビリティ水素官民協議会 etc.)
- 各種支援 (車両・燃料・水素ST・インセンティブ) ・ 規制緩和

etc.

2. 研究開発計画／（0）課題の対策方法（FCEV）

FCEV普及に向けた対策 FCEV


水素充填マネジメントシステムによるロスタイム低減とFCEV利用時の利便性向上

1. 水素ST渋滞回避やSTへの往復移動時間によるロスタイムゼロ化

- 運行管理と一体化した**水素充填マネジメントシステム**
- **水素STの整備/運営(営業時間など)最適化**
- **水素STの状況と配送計画の連携**


水素ST状況：故障や定期メンテナンス、充填渋滞など

配送車両の充填時間のパターン（東京都江東区の水素STでの例）

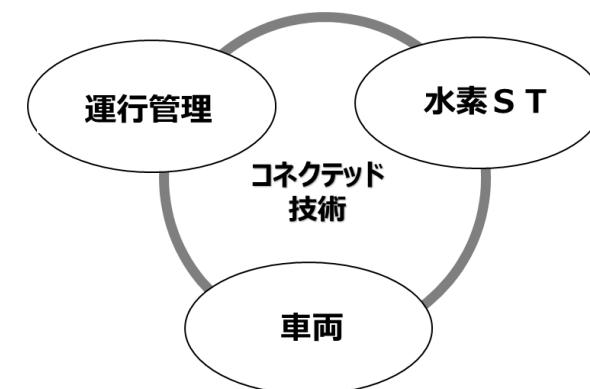

2. 水素充填を考慮した最適運行計画の提供

- 車両の使用方法、外乱要因を考慮した**燃費推定最適化**
- 水素残量を考慮した**配送ルート最適化**と**充填タイミング最適化**

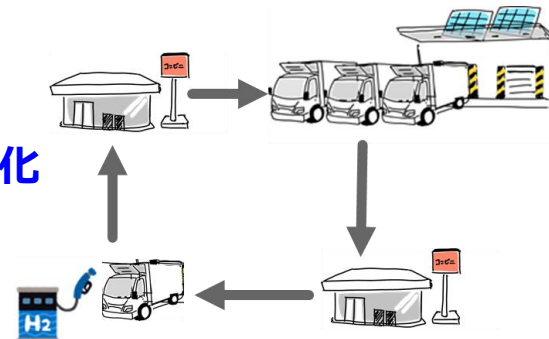

<外乱要因>

運転操作、架装物、荷量
気温、交通渋滞、道路勾配

<最適化パラメーター>

時間、走行距離

<汎用性>

業種、地域

2. 研究開発計画／（1）研究開発目標

アウトプット目標を達成するために必要なKPI

FCEV

研究開発項目		アウトプット目標		
1. エネルギーマネジメント (FCEV車両)		<div>・水素充填に伴う充填待ち時間 ゼロ（先行する一般車の充填待ち7分※1を除く）</div> <div>・コンベ車での配送 + GS ※2までの往復時間と比較して、 FCEVでの配送 + 水素STへの往復時間が同等以下※3</div> <div>・'30年政府目標※4の実現に向けて、商用車の電動化を推進しCO2排出量を削減 ⇒'13年比で'30年までに 約600万トン 削減（商用車全体における Tank to Wheel での試算値）</div> <div>・上記に向けた足元の取り組みとして、地域/事業者を限定したGI実証を実施 実証で導入予定の台数をすべてFCEV/BEV化できた場合の試算：約 1 万トン /年 削減（FCEV/BEV合計）</div> <div>※1: 3kgの水素充填で復圧時間を含んだ時間 ※2: インタンクを持つ事業者に対しても事業所付近のGSまで給油に行く前提 ※3: 水素STがある配送エリアへの電動車利用提案と合わせて実現 ※4: 8t以下の小型車:新車販売における電動化率20~30% 大型車:電動車保有 5 千台</div>		
研究開発内容		KPI	KPIの考え方	目標値
1 FCEV車両の水素消費量 高精度推定技術		①推定精度 ②水素消費量(予測)の演算時間	航続可能距離や充填タイミングを計算する上で、配送経路や日時で決定する車速や道路勾配、荷量、気温等をもとに、水素消費量を事前に予測し、精度と演算時間を両立したモデル構築	①精度10%以内 ※ 環境により 精度変動あり (仮置き 今後実証内で調整) ②1[s]以内 (通信遅延等含まず)
2 配送経路計画および 水素充填タイミングの最適化		①充填 + 付随時間(ST往復/充填待ち時間) ②配送出発から帰着までの時間 ③配送経路計画の演算時間	水素充填計画と配送経路計画を両方考慮した最適化計算により、充填による追加時間と配送時間を最小化 実用的、効率的な演算時間の設定	①② 充填時間を含めコンベ同等以下 ③30[min]以内 (複合経路の最適化) 90[s]以内 (単一経路随時更新)
3 水素STの最適配置、 STオペレーション条件抽出		①1STの日当たりの水素充填量 ②運営費低減代 ③CO2排出量低減代 ④充填待ち時間 ⑤STへの移動時間(往復)	物流オペレーションの成立を前提条件として、運営費やCO2排出量が最小となる最適な車両台数や車種 水素STの配置、設置数、営業時間の探索	①②③ 実証データから目標策定 ④待ち時間ゼロ ※先行一般車待ち時間除く ⑤配送計画を含めコンベ同等以下

2. 研究開発計画／（2）研究開発内容(これまでの取り組み)

個別の研究開発における技術課題と解決の見通し

FCEV

ST混雑状況サービスとST緊急通知システムを運用中。配送計画連携の水素充填タイミング提案を継続検討する

研究開発内容	KPI	詳細項目内容		進捗	課題
		実施内容	目的		
<div>1</div> <div>FCEV車両の水素消費量 高精度推定技術</div>	・推定精度 ・水素消費量(予測)の 演算時間	データ収集システム構築	データを収集するためのシステムを構築する。	・I/F-BOXとスマートフォンを 組み合わせたデータ収集シス テムのデータ絶対策APP のアップデート完了 ・小型トラック諸元/特性値 を基に、乗用車の車両モデ ルの変数を組み合わせたPF を準備 ・実車データを使って変動パ ラメータ推定検討実施中	・実証中にスマートフォンの電 源ボタン操作やスマホ操作で 通信受信できない場合あり。 継続して事業者様にスマホ オペレーション徹底をお願い。 ・モデル精度を高めるために 乗用サーバ間連携のセキュリ ティ確保
		データ収集・蓄積（小トラ用）	車両モデル開発用		
		データ収集・蓄積（大トラ用）	車両モデル開発用		
		データ収集・蓄積（小トラ 自動学習用）	車両モデル 自動学習に必要な種類と量を確保する		
		データ収集・蓄積（大トラ 自動学習用）	車両モデル 自動学習に必要な種類と量を確保する		
		車両モデル開発（小トラ ユニット）	小トラ用 パワトレユニットの特性推定		
		車両モデル開発（大トラ ユニット）	大トラ用 パワトレユニットの特性推定		
		小トラ変動パラメータ推定（諸元）	車格の差、積載量の推定、タイヤ転がり抵抗等の推定		
		大トラ変動パラメータ推定（諸元）	車格の差、積載量の推定、タイヤ転がり抵抗等の推定		
		小トラ車両変動パラメータ推定（環境）	空気抵抗、天候、気圧等による小トラのパラメータ変化の推定		
		大トラ車両変動パラメータ推定（環境）	空気抵抗、天候、気圧等による大トラのパラメータ変化の推定		
		推定モデル自動学習（小トラ）	ドライバー毎の運転の癖を学習し、水素消費量予測にFB		
		推定モデル自動学習（大トラ）	ドライバー毎の運転の癖を学習し、水素消費量予測にFB		
<div>2</div> <div>配送経路計画および 水素充填タイミング最適化</div>	・充填＋付随時間 (ST往復/充填待ち時間) ・配送出発～帰着までの時間 ・配送経路計画の演算時間	ユーザーヒアリング（小トラ）	各事業者の配送管理sys.把握と配送管理Sys.の連携方法	・各事業者の配送計画の データ収集、状況把握に概 ね目途付け ・帰着可否判定とST立ち寄 りルート提案できるアルゴリズ ムのPOC作成し、ファースト トライバートナと実証中	・演算処理時間が実証KPI の30分に対して2h掛かる。 演算時間短縮を図る ・配送計画がSIP物流標準 化ガイドラインに非準拠であ り、入力データの整理整頓が 必要 ・物品搬入の作業時間や休 憩時間にバラつきがあり、入 力データ化に課題あり
		ユーザーヒアリング（大トラ）	各事業者の配送管理sys.把握と配送管理Sys.の連携方法		
		データ収集・蓄積（小トラ）	配送計画作成のため実運用データを収集して蓄積		
		データ収集・蓄積（大トラ）	配送計画作成のため実運用データを収集して蓄積		
		データ収集・蓄積（小トラ 自動学習用）	配送計画 自動学習のため実運用データを収集して蓄積		
		データ収集・蓄積（大トラ 自動学習用）	配送計画 自動学習のため実運用データを収集して蓄積		
		帰着可否判定（小トラ）	配送計画に従い充填なく帰着できるか判定		
		帰着可否判定（大トラ）	配送計画に従い充填なく帰着できるか判定		
		ST立ち寄りルート提案（小トラ）	充填量に応じて水素STのルート提案		
		ST立ち寄りルート提案（大トラ）	充填量に応じて水素STのルート提案		
		充填計画 自動学習 提案(小トラ)	配達場所に応じた効率的なルート提案		
		充填計画 自動学習 提案(大トラ)	配達場所に応じた効率的なルート提案		
<div>3</div> <div>水素STの最適配置 水素ST運用条件抽出</div>	・1STの日当たり水素充填量 ・運営費低減代 ・CO2排出量低減代 ・充填待ち時間 ・STへの移動時間(往復)	シミュレーション	水素ST運営費/CO2排出量の最小化-最適条件導出用の シミュレーションツール開発	・ST稼働が高まると車両渋 滞によるダウンタイムが発生 することを予測する机上計 算を実施 ・緊急通知システムのGUIを レベルUP	配送計画システムを作成す るために、水素STの混雑予 測精度が必要。 【今後】 設置カメラの映像、車載デー タを分析し、実績稼働率と 目標稼働率を定量化する
		インフラ業者ヒアリング	予約システムやSYS連携方法		
		商用、乗用車ルール決め	トラック・バス・乗用車の水素充填のルール策定		
		充填平準化システム開発（単一ST）	ST側の供給能力と需要を最適バランスするシステムを構築		
		充填平準化システム開発（複数ST）	ST側の供給能力と需要を最適バランスするシステムを構築		
		充填タイミングと物流オペレーションの成立性（小トラ）	充填のために変更が伴う物流オペレーションの成立性を検証		
		充填タイミングと物流オペレーションの成立性（大トラ）	充填のために変更が伴う物流オペレーションの成立性を検証		

2. 研究開発計画／（2）研究開発内容(これまで及び今後の取り組み)

<凡例>

コンソ共通(FCEVのみ)

修正

各KPIの目標達成に向けた個別の研究開発の進捗度 FCEV

■ 着手済

○ 計画

● 実績(完了)

水素STの運用条件の最適化をインフラ事業者と継続議論。配送計画連携のための水素STのIOT化を推進する

研究開発内容	KPI	詳細項目内容		カテゴリ	'24/12 時期								進捗度	
		実施内容	目的		FY22	FY23	FY24	FY25	FY26	FY27	FY28	FY29		
1 FCEV車両の水素消費量 高精度推定技術	・推定精度 ・水素消費量(予測)の 演算時間	データ収集システム構築	データを収集するためのシステムを構築する。	共通	●	●	●							30% 大きな遅れ無し
		データ収集・蓄積（小トラ用）	車両モデル開発用	小トラ	●	●	●	○	○					
		データ収集・蓄積（大トラ用）	車両モデル開発用	大トラ				○	○					
		データ収集・蓄積（小トラ 自動学習用）	車両モデル 自動学習に必要な種類と量を確保する	小トラ(自動学習)						○	○	○		
		データ収集・蓄積（大トラ 自動学習用）	車両モデル 自動学習に必要な種類と量を確保する	大トラ(自動学習)						○	○	○		
		車両モデル開発（小トラ ユニット）	小トラ用 パワトレユニットの特性推定	小トラ		●	●							
		車両モデル開発（大トラ ユニット）	大トラ用 パワトレユニットの特性推定	大トラ				○	○					
		小トラ変動パラメータ推定（諸元）	車格の差、積載量の推定、タイヤ転がり抵抗等の推定	小トラ			○	○	○					
		大トラ変動パラメータ推定（諸元）	車格の差、積載量の推定、タイヤ転がり抵抗等の推定	大トラ					○	○	○			
		小トラ車両変動パラメータ推定（環境）	空気抵抗、天候、気圧等による小トラのパラメータ変化の推定	小トラ				○	○					
		大トラ車両変動パラメータ推定（環境）	空気抵抗、天候、気圧等による大トラのパラメータ変化の推定	大トラ					○	○	○			
		推定モデル自動学習（小トラ）	ドライバー毎の運転の癖を学習し、水素消費量予測にFB	小トラ(自動学習)						○	○	○		
		推定モデル自動学習（大トラ）	ドライバー毎の運転の癖を学習し、水素消費量予測にFB	大トラ（自動学習）							○	○	○	
2 配送経路計画および 水素充填タイミング最適化	・充填＋付随時間 (ST往復/充填待ち時間) ・配送出発～帰着までの時間 ・配送経路計画の演算時間	ユーザーヒアリング（小トラ）	各事業者の配送管理sys.把握と配送管理Sys.の連携方法	小トラ	●	●	●							30% 大きな遅れ無し
		ユーザーヒアリング（大トラ）	各事業者の配送管理sys.把握と配送管理Sys.の連携方法	大トラ				○	○					
		データ収集・蓄積（小トラ）	配送計画作成のため実運用データを収集して蓄積	小トラ		●	●	○	○					
		データ収集・蓄積（大トラ）	配送計画作成のため実運用データを収集して蓄積	大トラ				○	○					
		データ収集・蓄積（小トラ 自動学習用）	配送計画 自動学習のため実運用データを収集して蓄積	小トラ(自動学習)						○	○	○		
		データ収集・蓄積（大トラ 自動学習用）	配送計画 自動学習のため実運用データを収集して蓄積	大トラ（自動学習）						○	○	○		
		帰着可否判定（小トラ）	配送計画に従い充填なく帰着できるか判定	小トラ		●	●							
		帰着可否判定（大トラ）	配送計画に従い充填なく帰着できるか判定	大トラ				○	○	○				
		ST立ち寄りルート提案（小トラ）	充填量に応じて水素STのルート提案	小トラ			●	○	○					
		ST立ち寄りルート提案（大トラ）	充填量に応じて水素STのルート提案	大トラ					○	○	○			
		充填計画 自動学習 提案(小トラ)	配達場所に応じた効率的なルート提案	小トラ(自動学習)						○	○	○		
		充填計画 自動学習 提案(大トラ)	配達場所に応じた効率的なルート提案	大トラ(自動学習)						○	○	○		
		3 水素STの最適配置 水素ST運用条件抽出	・1STの日当たり水素充填量 ・運営費低減代 ・CO2排出量低減代 ・充填待ち時間 ・STへの移動時間(往復)	シミュレーション	水素ST運営費/CO2排出量の最小化-最適条件導出用のシミュレーションツール開発	共通		●	●					
インフラ業者ヒアリング	予約システムやSYS連携方法			共通	●	●	○							
商用、乗用車ルール決め	トラック・バス・乗用車の水素充填のルール策定			共通		●	○	○						
充填平準化システム開発（単一ST）	ST側の供給能力と需要を最適バランスするシステムを構築			単一ST				○	○	○				
充填平準化システム開発（複数ST）	ST側の供給能力と需要を最適バランスするシステムを構築			複数ST						○	○	○		
充填タイミングと物流オペレーションの成立性（小トラ）	充填のために変更が伴う物流オペレーションの成立性を検証			小トラ						○	○	○		
充填タイミングと物流オペレーションの成立性（大トラ）	充填のために変更が伴う物流オペレーションの成立性を検証			大トラ						○	○	○		

開発日程上の遅れはないが
この後の実社会での検討/課題が
大きいのでこの進捗度とした

2. 研究開発計画／（0）課題と対策方法（BEV）

BEV普及に向けた対策 BEV


充電マネジメントシステムによる電力需要の平準化とBEV利用時の利便性向上

1. 電力需要の平準化によるコスト削減

パターン1

■ 自事業所内での充電タイミング調整による電力需要の平準化


- ・配送計画/走行距離/車両状態/建屋電力を基に充電計画立案、コントロール
- ・外乱等による突発的な配送計画変更への柔軟な対応

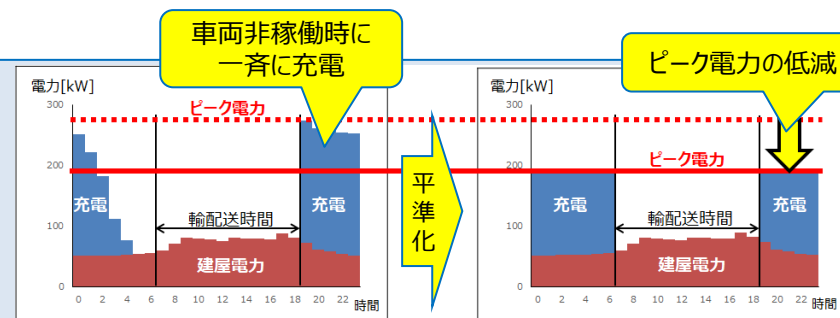

パターン2

■ 自事業所外を含めた全体での電力需要平準化と充電器の稼働率向上


- ・自社の別事業所や他社の充電計画も含めた建屋電力(BEMS)とのマッチング
- ・公共充電ステーションの使用も考慮した充電計画

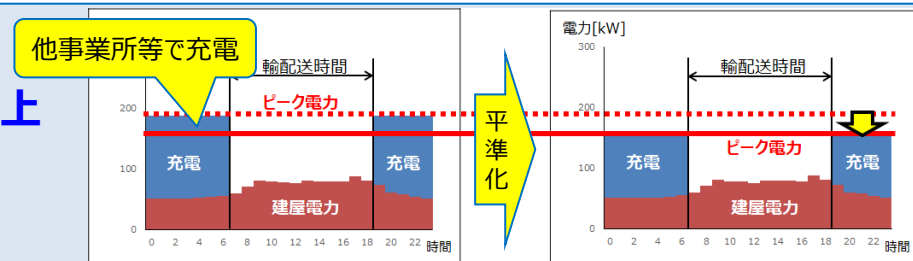

パターン3

■ 蓄電池（カートリッジ式含む）活用による電力需要平準化

- ・建屋電力(BEMS)と蓄電池充電計画のマッチング
- ・予備蓄電池流動数/蓄電池充電ステーションの最適配置

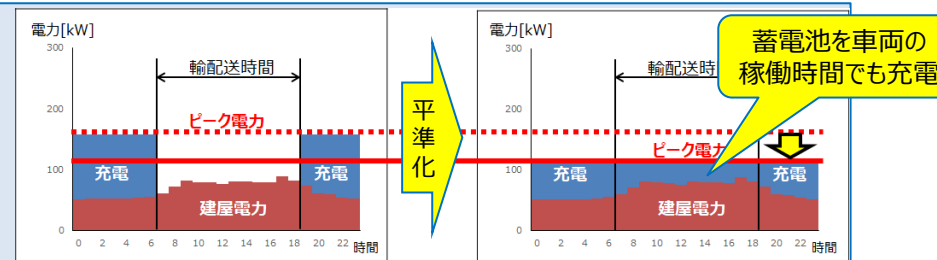

2. 充電タイミング・配送計画の最適化による利便性向上

- 車両の使用方法、外乱要因を考慮した電費推定最適化
- 電池残量を考慮した配送ルート/充電タイミング最適化（配送途中で公共充電設備で充電、昼に事業所に戻って充電 など）

2. 研究開発計画／（1）研究開発目標

アウトプット目標を達成するために必要なKPI BEV

研究開発項目		アウトプット目標		
1. エネルギーマネジメント (BEV車両)		<ul style="list-style-type: none">・自事業所内での充電に伴う電力負荷の最小化（成り行きの電力※1に対して45%削減※2）・コンベ車両からBEV車両に置き換えたことによる配送のダウンタイムゼロ・'30年政府目標※3の実現に向けて、商用車の電動化を推進しCO2排出量を削減 ⇒'13年比で'30年までに 約600万ト 削減（商用車全体における Tank to Wheel での試算値）・上記に向けた足元の取り組みとして、地域/事業者を限定したGI実証を実施 実証で導入予定の台数をすべてFCEV/BEV化できた場合の試算：約 1 万ト /年 削減（FCEV/BEV合計） <p>※1: 全電動車に対し同時に普通充電開始時の建屋電力の最大使用量 ※2: パターン2の自社内外充電まで実施時の電力量削減率 ※3: 8t以下の小型車:新車販売における電動化率20~30% 大型車:電動車保有 5 千台</p>		
研究開発内容		KPI	KPI考え方	目標値
① BEV車両の電気消費量 高精度推定技術		①推定精度 ②電気消費量(予測)の演算時間	航続可能距離や充電タイミングを計算する上で、配送経路や日時で決定する車速や道路勾配、荷量、気温等をもとに、電気消費量を事前に予測し、精度と演算時間を両立したモデル構築	①精度誤差10%以内 ※ 環境により精度変動あり（仮置き 今後実証内で調整） ② 1[s]以内（通信遅延等含まず）
② 配送経路計画立案および 充電タイミングの最適化		①充電+付随時間（充電施設往復/待ち時間） ②配送出発から帰着までの時間 ③配送経路計画の演算時間	充電計画と配送経路計画を両方考慮した最適化計算により、充電による追加時間と配送時間を最小化 実用的、効率的な演算時間の設定	①② 充電時間を含め、コンベ同等以下 ③45[min]以内（複合経路の最適化） 90[s]以内（単一経路随時更新）
③ 充電器の最適配置検討、 充電オペレーション条件抽出		①コスト低減代（ランニング、イニシャル） ②充電器稼働率（急速：経路充電向け） ③Ptag(次頁参照)	物流オペレーションの成立を前提条件として、電力コスト(電気代や充電器設置等)が最小となる最適な充電器(拠点内外)の組み合わせと設置数を探索、充電+建屋電力のピーク出力を最小化	①③ 成行コスト比45%削減 ② 実証データから目標策定

2. 研究開発計画／（2）研究開発内容（これまでの取組み）

個別の研究開発における技術課題と解決の見通し

BEV

配送計画連携のタイミング提案ロジックによる実証開始。課題解決しながらロジックを鍛えていく

研究開発内容	KPI	詳細項目内容		カテゴリ	進捗	課題
		実施内容	目的			
1 BEV車両の電力消費量 高精度推定技術の開発	・推定精度 ・電気消費量(予測)の 演算時間	データ収集システム構築	データを収集するためのシステムを構築する。	共通	・I/F-BOXとスマートフォンを組み合わせたデータ収集システムのデータ絶対対策APPのアップデート完了 ・小型トラック諸元/特性値を基に、乗用車の車両モデルの変数を組み合わせたPFを準備 ・実車データを使って変動パラメータ推定検討実施中	・実証中にスマートフォンの電源ボタン操作やスマホ操作で通信受信できない場合あり。継続して事業者様にスマホオペレーション徹底をお願い。 ・モデル精度を高めるために乗用サーバ間連携のセキュリティ確保
		データ収集・蓄積（小トラ）	車両モデル開発用	小トラ		
		データ収集・蓄積（軽バン）	車両モデル開発用	軽バン		
		データ収集・蓄積（小トラ 自動学習用）	車両モデル 自動学習に必要な種類と量を確保する	小トラ(自動学習)		
		データ収集・蓄積（軽バン 自動学習用）	車両モデル 自動学習に必要な種類と量を確保する	軽バン(自動学習)		
		車両モデル開発（小トラ ユニット）	パワトレユニットの特性推定	小トラ		
		車両モデル開発（軽バン ユニット）	パワトレユニットの特性推定	軽バン		
		小トラ変動パラメータ推定（諸元）	車格の差、積載量の推定、タイヤ転がり抵抗等の推定	小トラ		
		軽バン変動パラメータ推定（諸元）	車格の差、積載量の推定、タイヤ転がり抵抗等の推定	軽バン		
		小トラ車両変動パラメータ推定（環境）	空気抵抗、天候、気圧等による小トラのパラメータ変化の推定	小トラ		
		軽バン車両変動パラメータ推定（環境）	空気抵抗、天候、気圧等による軽バンのパラメータ変化の推定	軽バン		
		推定モデル自動学習（小トラ）	ドライバー毎の運転の癖を学習し、電力消費量予測にFB	小トラ(自動学習)		
		推定モデル自動学習（軽バン）	ドライバー毎の運転の癖を学習し、電力消費量予測にFB	軽バン(自動学習)		
2 配送経路計画立案および 充電タイミングの最適化	・充電+付随時間 (充電施設往復/待ち時間) ・配送出発から帰着までの時間 ・配送経路計画の演算時間	ユーザーヒアリング（小トラ）	各事業者の配送管理sys.把握と配送管理Sys.の連携方法	小トラ	・各事業者の配送計画のデータ収集、状況把握に概ね目途付け ・帰着可否判定とST立ち寄りルート提案できるアルゴリズムのPOC作成し、ファーストライバートナと実証開始	・演算処理時間が実証KPIの30分に対して2h掛かる。演算時間短縮を図る ・配送計画がSIP物流標準化ガイドラインに非準拠であり、入力データの整理整頓が必要 ・物品搬入の作業時間や休憩時間にバラつきがあり、システム入力情報のデータ化に課題あり
		ユーザーヒアリング（軽バン）	各事業者の配送管理sys.把握と配送管理Sys.の連携方法	軽バン		
		データ収集・蓄積（小トラ）	配送計画作成のため実運用データを収集して蓄積	小トラ		
		データ収集・蓄積（軽バン）	配送計画作成のため実運用データを収集して蓄積	軽バン		
		データ収集・蓄積（小トラ 自動学習用）	配送計画 自動学習のため実運用データを収集して蓄積	小トラ(自動学習)		
		データ収集・蓄積（軽バン 自動学習用）	配送計画 自動学習のため実運用データを収集して蓄積	軽バン(自動学習)		
		帰着可否判定（小トラ）	配送計画に従い充電なく帰着できるか判定	小トラ		
		帰着可否判定（軽バン）	配送計画に従い充電なく帰着できるか判定	軽バン		
		ST立ち寄りルート提案（小トラ）	充電量に応じて充電STのルート提案	小トラ		
		ST立ち寄りルート提案（軽バン）	充電量に応じて充電STのルート提案	軽バン		
		充電計画 自動学習 提案(小トラ)	配達場所に応じた効率的なルート提案	小トラ(自動学習)		
		充電計画 自動学習 提案(軽バン)	配達場所に応じた効率的なルート提案	軽バン(自動学習)		
3 充電器の最適設置数 充電オペレーション 条件抽出	・台当りの必要充電量 ・充電時間 ・コスト低減代 ・充電器稼働率 ・Ptag ・システム演算時間	インフラ業者ヒアリング	予約システムやSYS連携方法	共通	・契約電力を超えないような 充電最適化/ピークシフト制御を構築目途付け ・拠点内充電器と各車両を紐づけする 個車認証システムを構築目途付け ・日々データを分析し、配送計画連携による拠点内充電タイミング提案する実証を開始。車両と充電器の相関を机上シミュレーション実施	・経路充填の為の充電STの予約システムは確立していない、予約していない方へのオペレーション検討が必要。 ・都内では急速充電ST設置には借地等の制約があり、ST稼働率、利便性の両面の成立は限定的な場所となる。 ・急速充電器、普通充電器の故障が散発しバックアップ的な充電システムが必要。充電器に対して事業化では故障率定義が必要
		シミュレーション	配送計画から充電電力総量予測・建屋最大電力最小化の充電計画を立案検証建屋ごと充電器種（NC・QC）と基数のコスト最小化最適解を検証・導出	固定式電池		
		シミュレーション（カートリッジ式含む）	カートリッジ式による基数のコスト最小化最適解を検証・導出	カートリッジ式電池		
		電力負荷平準化システム開発	建屋電力と充電量を目標デマンド値に抑えるように制御	固定式電池		
		電力負荷平準化システム開発（カートリッジ式含む）	カートリッジ式バッテリーの平準化システム構築	カートリッジ式電池		
		充電ST平準化システム開発	ST側の供給能力と需要を最適バランスするシステムを構築	固定式電池		
		充電ST平準化システム開発（カートリッジ式含む）	カートリッジ式バッテリーの平準化システム構築	カートリッジ式電池		
		充電タイミングと物流オペレーションの成立性（小トラ）	充電のために変更が伴う物流オペレーションの成立性を検証	小トラ		
		充電タイミングと物流オペレーションの成立性（軽バン）	充電のために変更が伴う物流オペレーションの成立性を検証	軽バン		

2. 研究開発計画／（2）研究開発内容（これまで及び今後の取組み）

<凡例>

■ 着手済

○ 計画

● 実績(完了)

コンソ共通(BEVのみ)

修正

各KPIの目標達成に向けた個別の研究開発の進捗度 BEV


予定通り進捗。物流オペレーションの改善を実証通じて鍛えていく。

開発日程上の遅れはないが
この後の実社会での検討/課題が
大きいためこの進捗度とした

研究開発内容	KPI	詳細項目内容		カテゴリ	時期								進捗度
		実施内容	目的		FY22	FY23	FY24	FY25	FY26	FY27	FY28	FY29	
1 BEV車両の電力消費量 高精度推定技術の開発	・推定精度 ・電気消費量(予測)の 演算時間	データ収集システム構築	データを収集するためのシステムを構築する。	共通	●	●	●						30% 大きな遅れ 無し
		データ収集・蓄積（小トラ）	車両モデル開発用	小トラ	●	●	●	○	○				
		データ収集・蓄積（軽バン）	車両モデル開発用	軽バン				○	○				
		データ収集・蓄積（小トラ 自動学習用）	車両モデル 自動学習に必要な種類と量を確保する	小トラ(自動学習)						○	○	○	
		データ収集・蓄積（軽バン 自動学習用）	車両モデル 自動学習に必要な種類と量を確保する	軽バン(自動学習)						○	○	○	
		車両モデル開発（小トラ ユニット）	パワトレユニットの特性推定	小トラ		●	●						
		車両モデル開発（軽バン ユニット）	パワトレユニットの特性推定	軽バン				○					
		小トラ変動パラメータ推定（諸元）	車格の差、積載量の推定、タイヤ転がり抵抗等の推定	小トラ				○	○				
		軽バン変動パラメータ推定（諸元）	車格の差、積載量の推定、タイヤ転がり抵抗等の推定	軽バン				○	○				
		小トラ車両変動パラメータ推定（環境）	空気抵抗、天候、気圧等による小トラのパラメータ変化の推定	小トラ				○	○				
		軽バン車両変動パラメータ推定（環境）	空気抵抗、天候、気圧等による軽バンのパラメータ変化の推定	軽バン					○	○			
		推定モデル自動学習（小トラ）	ドライバー毎の運転の癖を学習し、電力消費量予測にFB	小トラ(自動学習)						○	○	○	
		推定モデル自動学習（軽バン）	ドライバー毎の運転の癖を学習し、電力消費量予測にFB	軽バン(自動学習)						○	○	○	
2 配送経路計画立案および 充電タイミングの最適化	・充電+付随時間 (充電施設往復/待ち時間) ・配送出発から帰着までの時間 ・配送経路計画の演算時間	ユーザーヒアリング（小トラ）	各事業者の配送管理sys.把握と配送管理Sys.の連携方法	小トラ	●	●	●						30% 大きな遅れ 無し
		ユーザーヒアリング（軽バン）	各事業者の配送管理sys.把握と配送管理Sys.の連携方法	軽バン				○					
		データ収集・蓄積（小トラ）	配送計画作成のため実運用データを収集して蓄積	小トラ		●	●	○	○				
		データ収集・蓄積（軽バン）	配送計画作成のため実運用データを収集して蓄積	軽バン				○	○	○	○		
		データ収集・蓄積（小トラ 自動学習用）	配送計画 自動学習のため実運用データを収集して蓄積	小トラ(自動学習)						○	○	○	
		データ収集・蓄積（軽バン 自動学習用）	配送計画 自動学習のため実運用データを収集して蓄積	軽バン(自動学習)						○	○	○	
		帰着可否判定（小トラ）	配送計画に従い充電なく帰着できるか判定	小トラ		●	●						
		帰着可否判定（軽バン）	配送計画に従い充電なく帰着できるか判定	軽バン				○					
		ST立ち寄りルート提案（小トラ）	充電量に応じて充電STのルート提案	小トラ			○	○	○				
		ST立ち寄りルート提案（軽バン）	充電量に応じて充電STのルート提案	軽バン				○	○				
		充電計画 自動学習 提案(小トラ)	配達場所に応じた効率的なルート提案	小トラ(自動学習)						○	○	○	
		充電計画 自動学習 提案(軽バン)	配達場所に応じた効率的なルート提案	軽バン(自動学習)						○	○	○	
		インフラ業者ヒアリング	予約システムやSYS連携方法	共通	●	●	●						
3 充電器の最適設置数 充電オペレーション 条件抽出	・台当りの必要充電量 ・充電時間 ・コスト低減代 ・充電器稼働率 ・Ptag ・システム演算時間	シミュレーション	配送計画から充電電力総量予測・建屋最大電力最小化の充電計画を立案 検証建屋ごと充電器種（NC・QC）と基数のコスト最小化最適解を検証・導出	固定式電池		●	●	○					30% 大きな遅れ 無し
		シミュレーション（カートリッジ式含む）	カートリッジ式による基数のコスト最小化最適解を検証・導出	カートリッジ式電池					○	○	○		
		電力負荷平準化システム開発	建屋電力と充電量を目標デマンド値に抑えるように制御	固定式電池		●	●	○					
		電力負荷平準化システム開発（カートリッジ式含む）	カートリッジ式バッテリーの平準化システム構築	カートリッジ式電池					○	○	○		
		充電ST平準化システム開発	ST側の供給能力と需要を最適バランスするシステムを構築	固定式電池			○	○	○				
		充電ST平準化システム開発（カートリッジ式含む）	カートリッジ式バッテリーの平準化システム構築	カートリッジ式電池						○	○	○	
		充電タイミングと物流オペレーションの成立性（小トラ）	充電のために変更が伴う物流オペレーションの成立性を検証	小トラ						○	○	○	
		充電タイミングと物流オペレーションの成立性（軽バン）	充電のために変更が伴う物流オペレーションの成立性を検証	軽バン						○	○	○	


複数の研究開発を効率的に連携させるためのスケジュール

※車両によって、台数や期間の見直し計画中

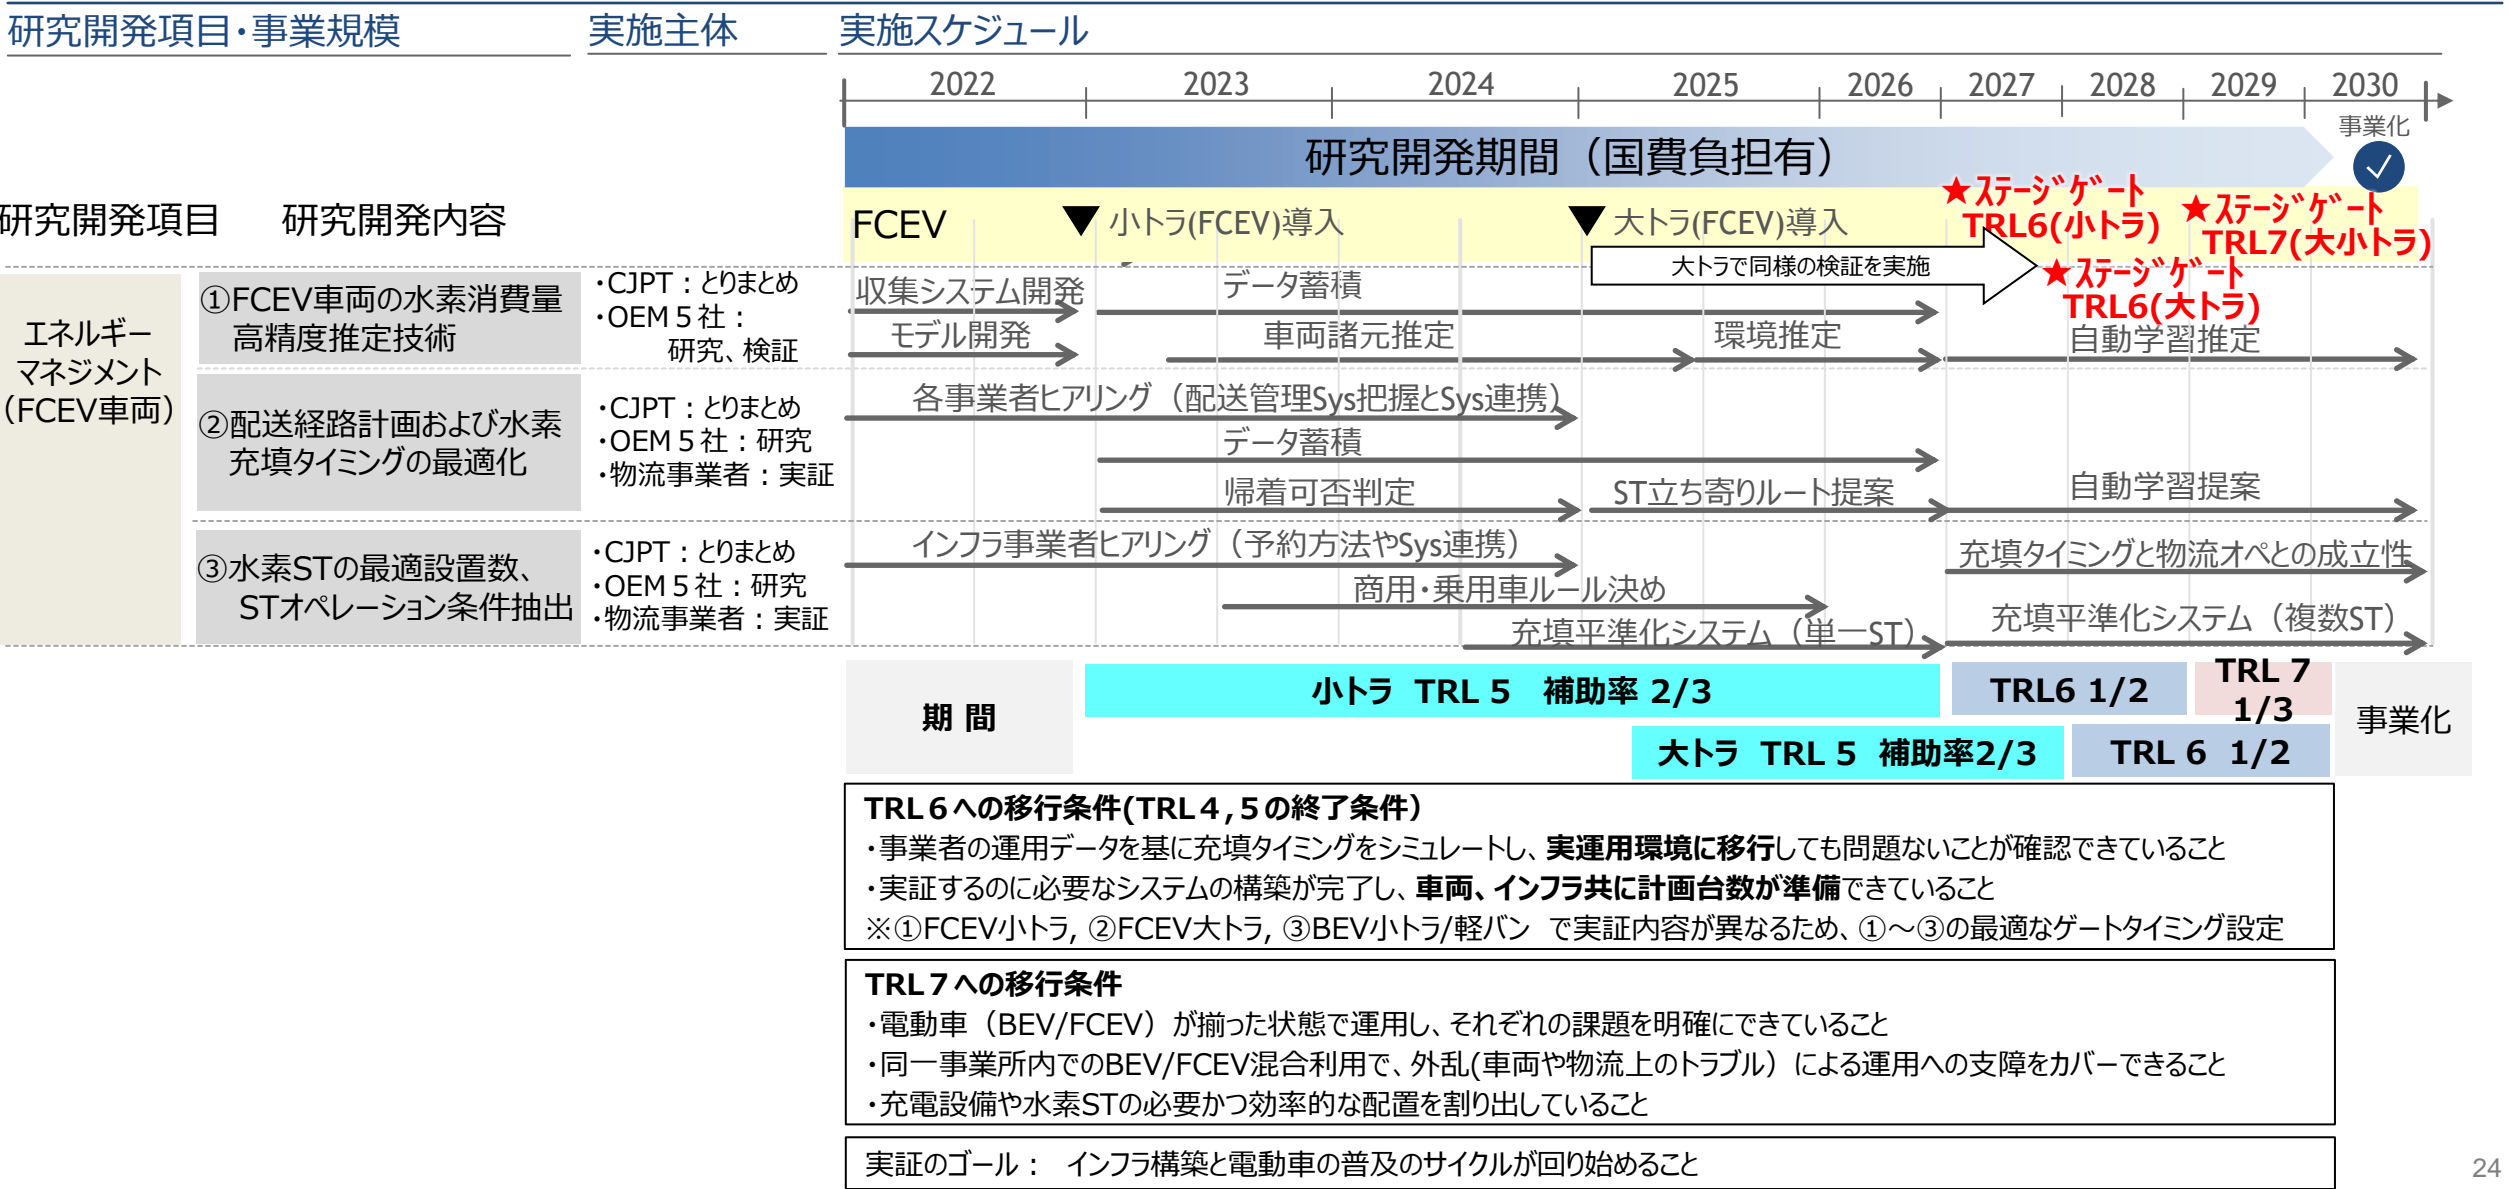

複数の研究開発を効率的に連携させるためのスケジュール

※車両によって、台数や期間の見直し計画中

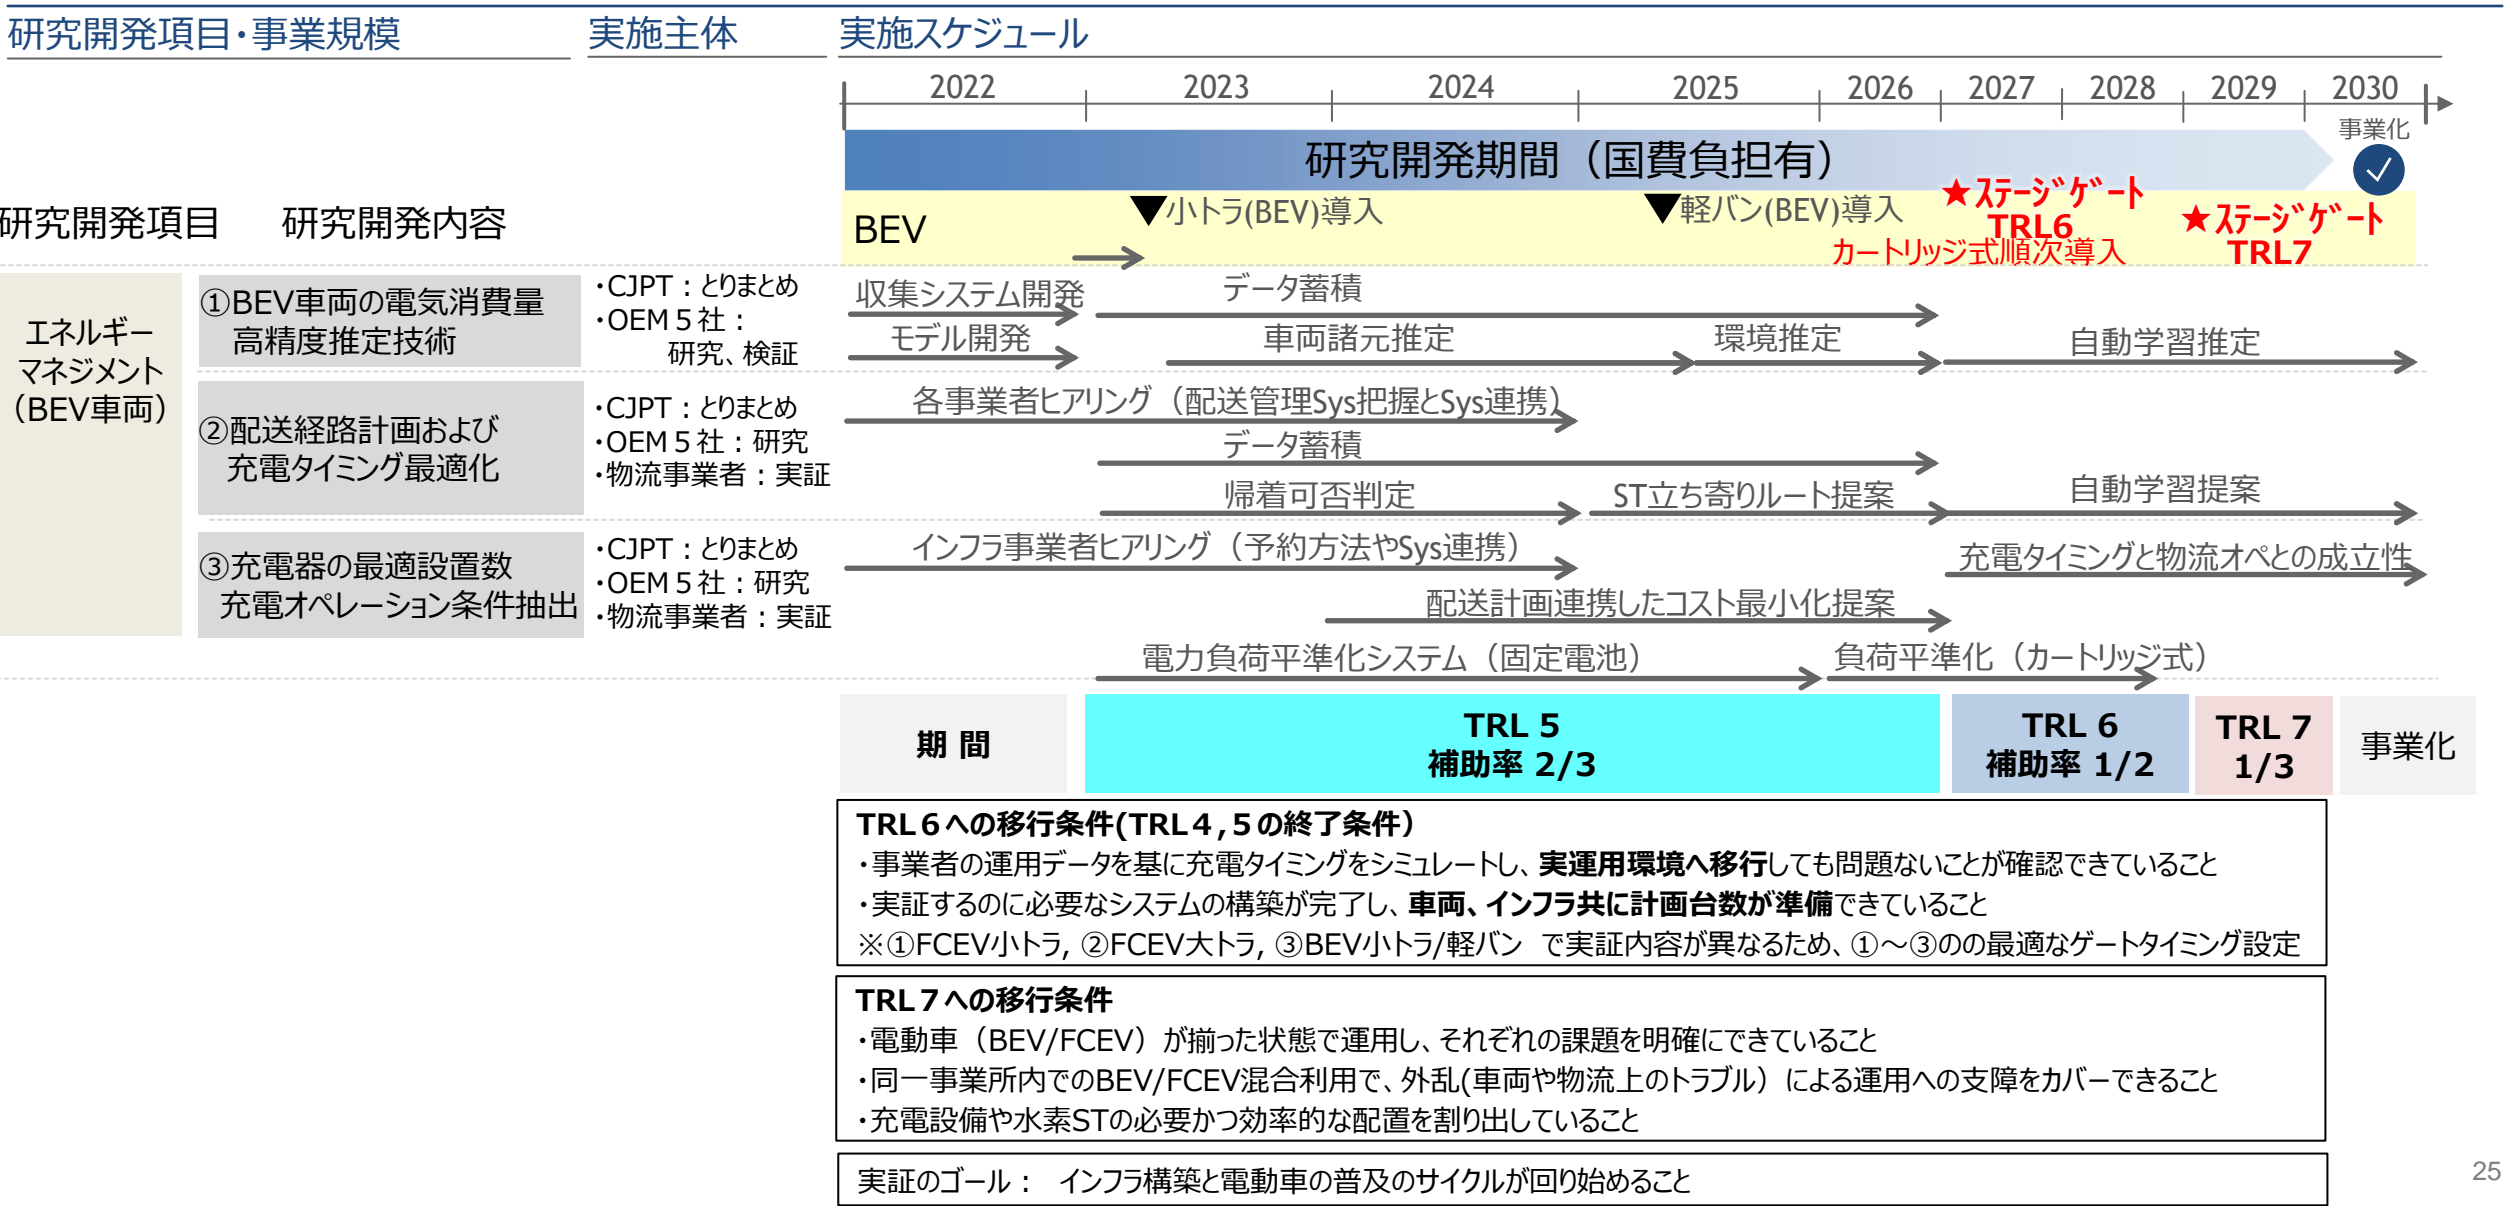

2. 研究開発計画／（4）研究開発体制


FCEV

BEV

各主体の特長を生かせる研究開発実施体制と役割分担を構築

実施体制図

CJPT・物流大手6社・コンビニ3社の10社を「**共同実施者**」として研究を推進

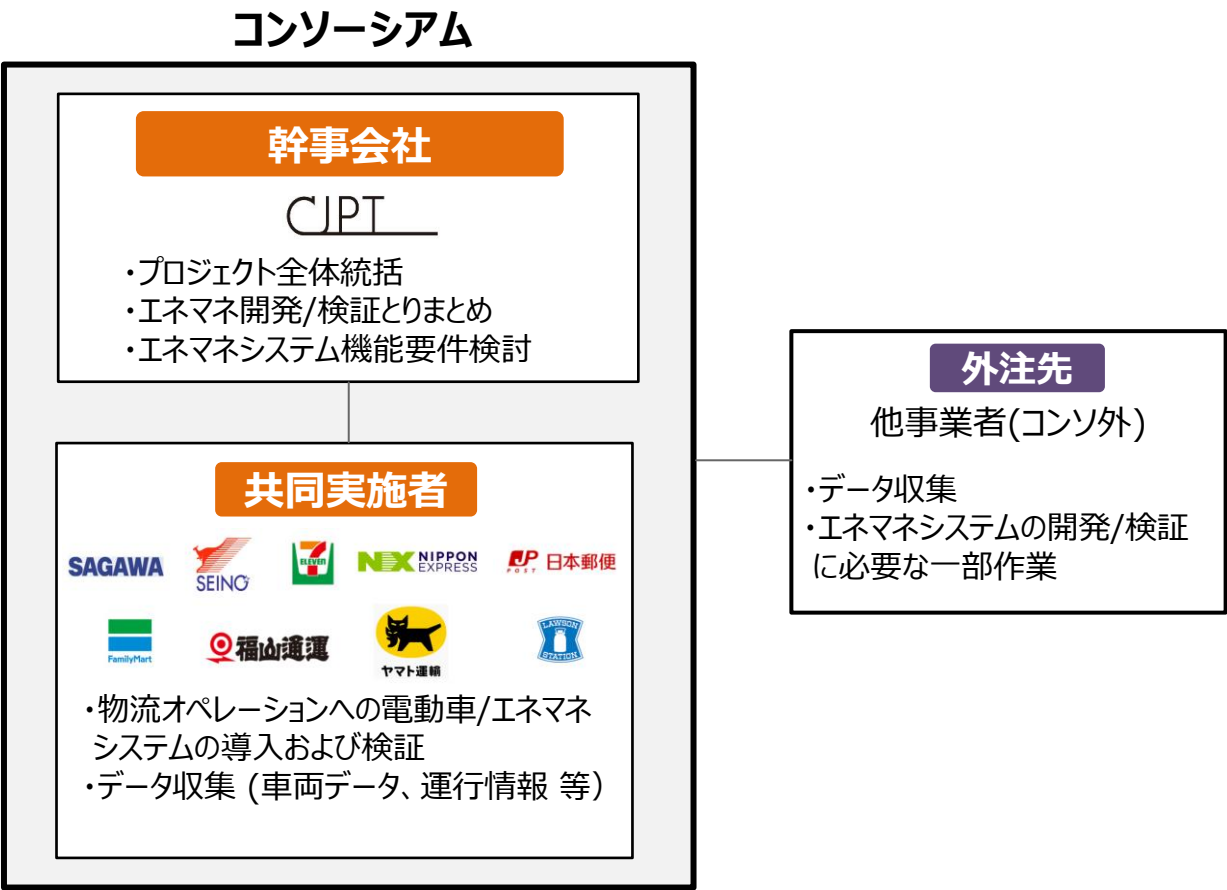

各主体の役割と連携方法

共同実施者

- CJPT (幹事会社)
 - ・プロジェクト全体統括
 - ・エネマネシステム開発/検証とりまとめ
 - ・エネマネシステム機能要件検討
- 物流大手6社・コンビニ3社
 - ・物流オペレーションへの電動車/エネマネシステムの導入および検証
 - ・データ収集（車両データ、運行情報 等）

- **連携方法**
- CJPTを中心とした各事業者間の定期連絡会や非定期コミュニケーションを通じ開発の進捗共有と課題管理を図る

※一部の企業は、FCEV/BEVいずれかのエネマネ開発/検証のみに参画

2. 研究開発計画／（5）技術的優位性

FCEV

BEV


国際的な競争の中での技術等における優位性

研究開発項目	研究開発内容	活用可能な技術等	競合他社に対する優位性・リスク
1. エネルギー マネジメント (FCEV車両)	車両消費 エネルギーの 推定技術	<ul style="list-style-type: none"> ハード単体自体の効率データ 物理モデリングノウハウ 機械学習技術 	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> 車両開発で培ったノウハウ/モデリング技術 <p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> 実車両ハード/制御を反映したモデル化 蓄積された実社会での走行データ
	充填・充電 × 配送の最適化	<ul style="list-style-type: none"> 交通流の推定技術 数理最適化 消費エネルギー推定技術 	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> 蓄積された実社会での走行データ <p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> 数理最適/AI分野のスタートアップ企業等と協調することでリスクを優位性に変えていく
	車両車種・ インフラの 最適な設置 数オペレー ション提案	<ul style="list-style-type: none"> ハード単体自体の効率データ 物理モデリングノウハウ 数理最適化 	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> パワトレフルラインナップの開発技術/蓄積データ <p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> 数理最適/AI分野のスタートアップ企業等と協調することでリスクを優位性に変えていく

実証地域と台数について

※車両によって、台数や期間の見直し計画中

下記地域(ルート)と車種の台数にて実施 (エネマネシステム検証の為、その他の地域、事業者、台数での実証も想定)

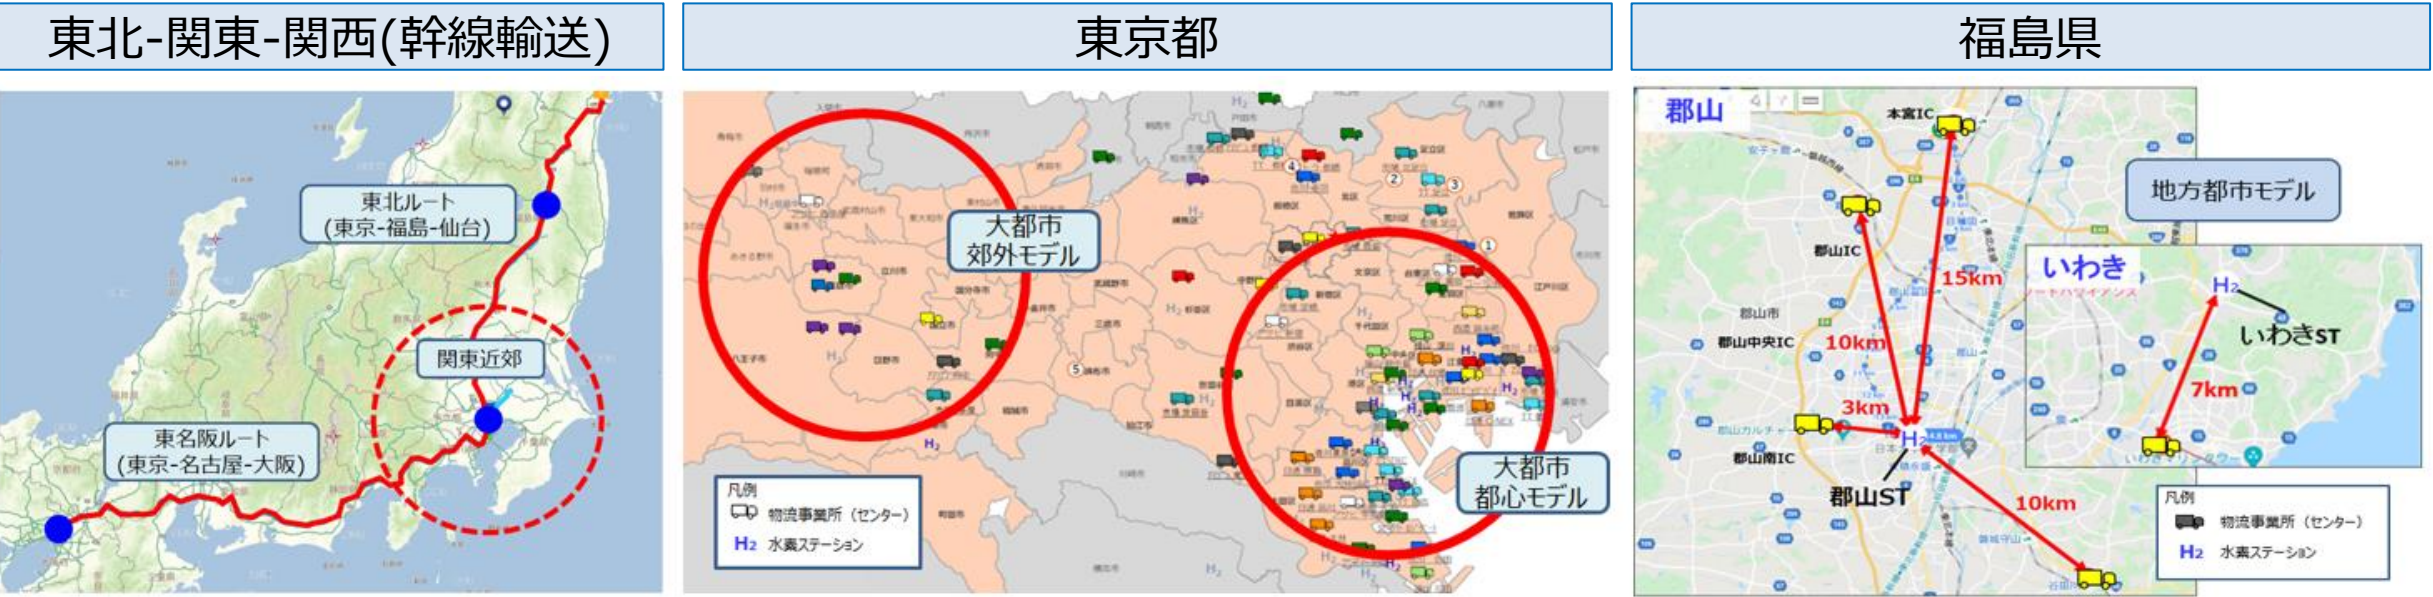

電動車	FCEV		BEV		
	大トラ	小トラ	小トラ積載3t	小トラ積載1t	軽バン
地域	東京を中心とした幹線輸送 (福島・大阪 etc.)		福島・東京	東京	
台数	50		250	145	70


3. イノベーション推進体制

(経営のコミットメントを示すマネジメントシート)

3. イノベーション推進体制／（1）組織内の事業推進体制

経営者のコミットメントの下、専門部署に複数チームを設置

組織内体制図

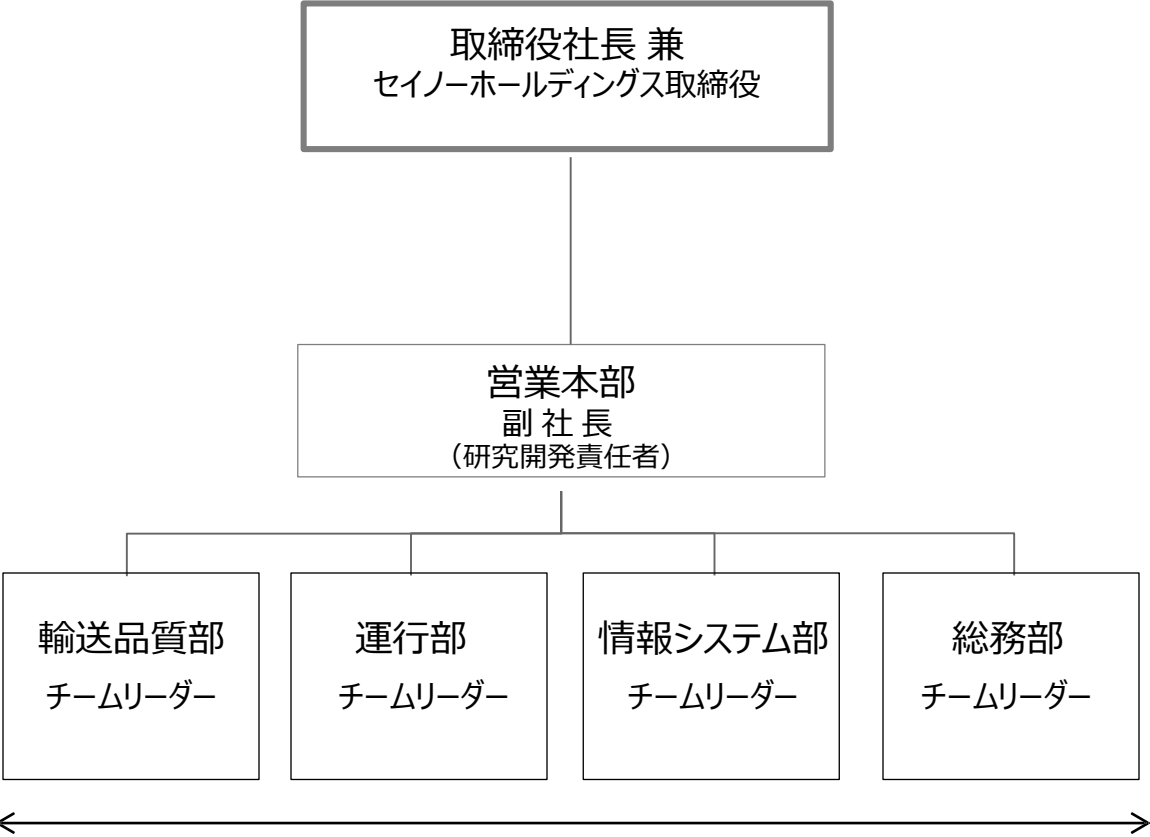

定期的なMTGを行い関係部署が情報共有して円滑な事業推進を行う

組織内の役割分担

【研究開発責任者と担当部署】

- **研究開発責任者**
副社長：本プロジェクトに関する指示、管理を担当
- **担当チーム**
 - 輸送品質部工務課：小型ZEVによる集配車両導入を担当（専任4人規模）
 - 運行部：大型ZEV車両における路線運航の管理及び、
充填施設 の選定を担当（専任5人規模）
 - 情報システム部：ZEV車両における配送実績データ管理を担当（専任4人規模）
 - 総務部
対外的に情報発信する報告書の作成、
車両が排出した温室効果ガスの実績測定、ZEV車両
導入効果を把握（専任3人規模）

3. イノベーション推進体制／（2）マネジメントチェック項目① 経営者等の事業への関与

経営者等によるカーボンニュートラル事業への関与の方針

経営者等による具体的な施策・活動方針

- 経営者のリーダーシップ
 - ① 当該事業における意思決定
 - ② 当該事業における当社の取組み、及びカーボンニュートラルに向けた事業戦略の情報発信
 - ③ 当該事業における、組織編制の承認及び決定
- 事業のモニタリング・管理
 - ① 週1回の事業進捗の確認
 - ② 事業の進捗具合に合わせた、追加・改善策の指示
 - ③ KPIの設定指示及び承認

事業の継続性確保の取組

- 毎月1回の6名で構成される、当社取締役会において、戦略投資など業務執行に関する会社の意思を迅速・適格に決定しており、当該事業に対しても例外なく議論される。



連携し事業の継続性を担保していく

- 当社の親会社であるセイノーホールディングスの取締役会は、社外取締役4名と、当社取締役社長含む10名で構成。

毎月1回開催する定例取締役会や必要に応じて開催する臨時取締役会において、事業再編や戦略投資など業務執行に関する会社の意思を迅速・適格に決定しており、当該事業に対しても例外なく議論される。

監査等委員会が、取締役の職務執行を監督しているため 経営層が交代する場合にも十分に事業が継続して実施される 仕組みとなっている。

3. イノベーション推進体制／（3）マネジメントチェック項目② 経営戦略における事業の位置づけ

経営戦略におけるカーボンニュートラルを重要な事業と位置づけ、広く情報発信

取締役会等での議論

- **カーボンニュートラルに向けた全社戦略**
 - 気候変動などの地球環境問題を会社経営の重要課題とし、さまざまな機会を通じて取り組む
 - 環境目標の設定・定期的な見直し、および環境施策を継続的に取り組む
 - 環境関連法令・協定等を遵守する
- **取締役会**

中期経営計画に「共創による地球環境社会への貢献」「業務連携による社会的課題解決」「継続的な社会実現に向けた取り組み」を開示するなどサステナビリティ関連の協議および審議も定期的に実施している。
- **リスク管理委員会**

企業経営リスクを明確にするとともにリスク管理上の影響度合いを審議・評価し、取締役会に報告を行うとともに、気候変動リスクについてもモニタリングしている。
- **セイノーホールディングス 経営企画室サステナビリティ推進課**

当該事業における各チームの人員をはじめとした、当社社員が併任されており、温暖化対策を含むサステナブルな取り組みに対し、事業会社の事業部門を含めた組織横断的な取り組みを推進している。

ステークホルダーに対する公表・説明

- **情報開示の方法**
 - 当社の親会社であるセイノーホールディングスでは、外部シナリオに基づく分析を行い、気候変動が当社の事業に及ぼすリスクや機会を予測し、当該事業を含め適切に対応していくことで、当社グループのレジリエンスが高まると認識しており、その認識に基づきシナリオ分析の結果、影響度が大きいと特定した項目について情報を開示していく
- **ステークホルダーへの説明**
 - 不確定な将来に対するリスクを低減するために脱炭素の手法が偏ることが無いように取り組みをしていくとともに広く情報収集し、TCFDのフレームワークを活用した分析を継続して行い、その分析結果を事業戦略に反映し、環境への対応や輸送の効率化、輸送ネットワークの維持を継続することで、予測が困難な未来においてもすべてのステークホルダーの皆様へ信頼され、共感していただける企業であり続けられるよう、IRの場をはじめ、幅広く情報発信していく
- 上記の公表に基づき、事業部門である当社は気候変動への対応を実行・推進していく

3. イノベーション推進体制／（4）マネジメントチェック項目③ 事業推進体制の確保

機動的に経営資源を投入し、着実に社会実装まで繋げられる組織体制を整備

- 親会社セイノーホールディングスに新たに専門的な組織として「**サステナビリティ推進課(2024年4月)**」発足。
気候変動に関する社会問題を重要な経営課題と捉え、気候変動に影響を及ぼすCO₂排出量の把握と削減に向けた取り組みを継続して推進していく組織体制を整備
- 西濃運輸を含むセイノーグループ全体で、事業活動から排出されるCO₂削減に寄与する運び方の改革と輸送事業のカーボンニュートラルに必要な商用電動車の社会実装に向けて取り組みを実行していく

カーボンニュートラルに向けた取り組みを継続して実行していく

ダブル連結トラック・モーダルシフトなど運び方の改革



商用電動車の社会実装に必要な課題解決に寄与する取り組みを実行

- 環境対応車両の導入でCO₂削減への取り組み

4. その他

4. その他／（1）想定されるリスク要因と対処方針

リスクに対して十分な対策を講じるが、本事業競争力の喪失が挽回不可能な場合には事業中止も検討

研究開発（技術）におけるリスクと対応

- 「当初仮説の誤り」：実証進展により当初仮説での目標未達成、挽回の目途無しがコンソ内で確認された場合
- 「各社の経営そのものに重大な影響を与える事象」の発生
- 「本事業競争力の低下・喪失」：当該事業の目標レベルを大きく超える挽回不可能な技術的ブレークスルーがあった場合

社会実装（経済社会）におけるリスクと対応

- 超安価な代替燃料の出現
- 水素価格の非合理的レベル高騰（投機資金の流入 等）
- 電気価格の非合理的レベル高騰（電力事業の海外資本算入）等の
- ・本事業の前提を大幅に上回る燃料価格の経済合理性の崩壊 や
- ・一般消費者の合理的経済行動に多大な影響をおよぼす可能性を鑑み
- 「本事業競争力の低下・喪失及び挽回目途がない」 場合

【対応ステップ案】

- ・コンソ内外での対応検討による 目標達成、本事業競争力の挽回可能性確認 （挽回可能→継続）
- ・中止決定時の社内外への影響予測とその対応検討および可否判断 （含む、“国民理解”の可能性）

事業中止の判断基準：以下 1・2 の確認・合意により事業中止を判断

1. コンソ内（外）での事業継続可能性が担保できない場合
2. 上記に加え、事業中止時の影響把握および対応方法の合意が得られた場合

4. その他／（2）社会・産業全体への貢献

車両電動化に向けた業界トップランナーとしての業界への取組

本事業を通じて得られた知見

■ 物流事業者

- ・水素価格が高騰し続けるとGI補助で軽油パリティに届かず持ち出し増
- ・更に、将来的にも水素を使えないという声あり
- ・インフラ整備が十分でないため、実証の導入を見送らざるを得ない可能性もあり
- ・自動EPB設定要望あり（'23/11より対応車両順次導入）

■ インフラ事業者

- ・新STへの投資計画を進めるにはFCの需要を集める必要がある
- ・現状の補助ではST運営も厳しく、水素価格を上げざるを得ない

実証を通じて、将来の水素普及に向けた
電動車への要望や課題が明確化 国からのサポートも必要

具体的な業界への取組

- 官民協議会に参画し具体的な取り組みについて議論
- 自治体と将来の電動車普及に向けた取り組みを議論
（東京都エネルギーアドバイザーボード、福島県）
- FC小トラ試乗会(トラック協会、省庁、水素議連)/G7展示



- 他地域への導入（福岡：FC小トラ導入）



- FCトラック人材教育 / 講演会(REIF福島/JH2A)



座学



FC小トラで実演



講演
